

Акт обследования

город Ясногорск

«13» мая 2020 года

Комиссия в составе:

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;
Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;
Хряпкин А. А. – начальник отдела административно – технического надзора администрации муниципального образования Ясногорский район

Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

В ходе обследования установлено, что по состоянию на 13.05.2020 выполнены следующие работы:


1. фундамент под основное здание, вспомогательные помещения и бункер для хранения мокрой соли;
2. заливка прямков и фундаментов под дымовые трубы;
3. подбетонное основание цоколя ЦМ2 (вспомогательные помещения), трамбовка до отметки «-0,8 м»;
4. устройство фундаментов под котлы и насосное оборудование;
5. произведена заливка подбетонного основания плиты пола (основное и вспомогательное помещение);
6. армирование и заливка плиты пола;
7. заливка фундаментов под котлы.


Ведутся подготовительные работы для монтажа металлоконструкций

Выводы: нарушение сроков строительства новой блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт с последующим выводом из эксплуатации существующей котельной Центральная

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:






Ю. А. Телков


А. А. Хряпкин

Н. А. Трубина

АО «РГК-1» 
Бурков В. В.

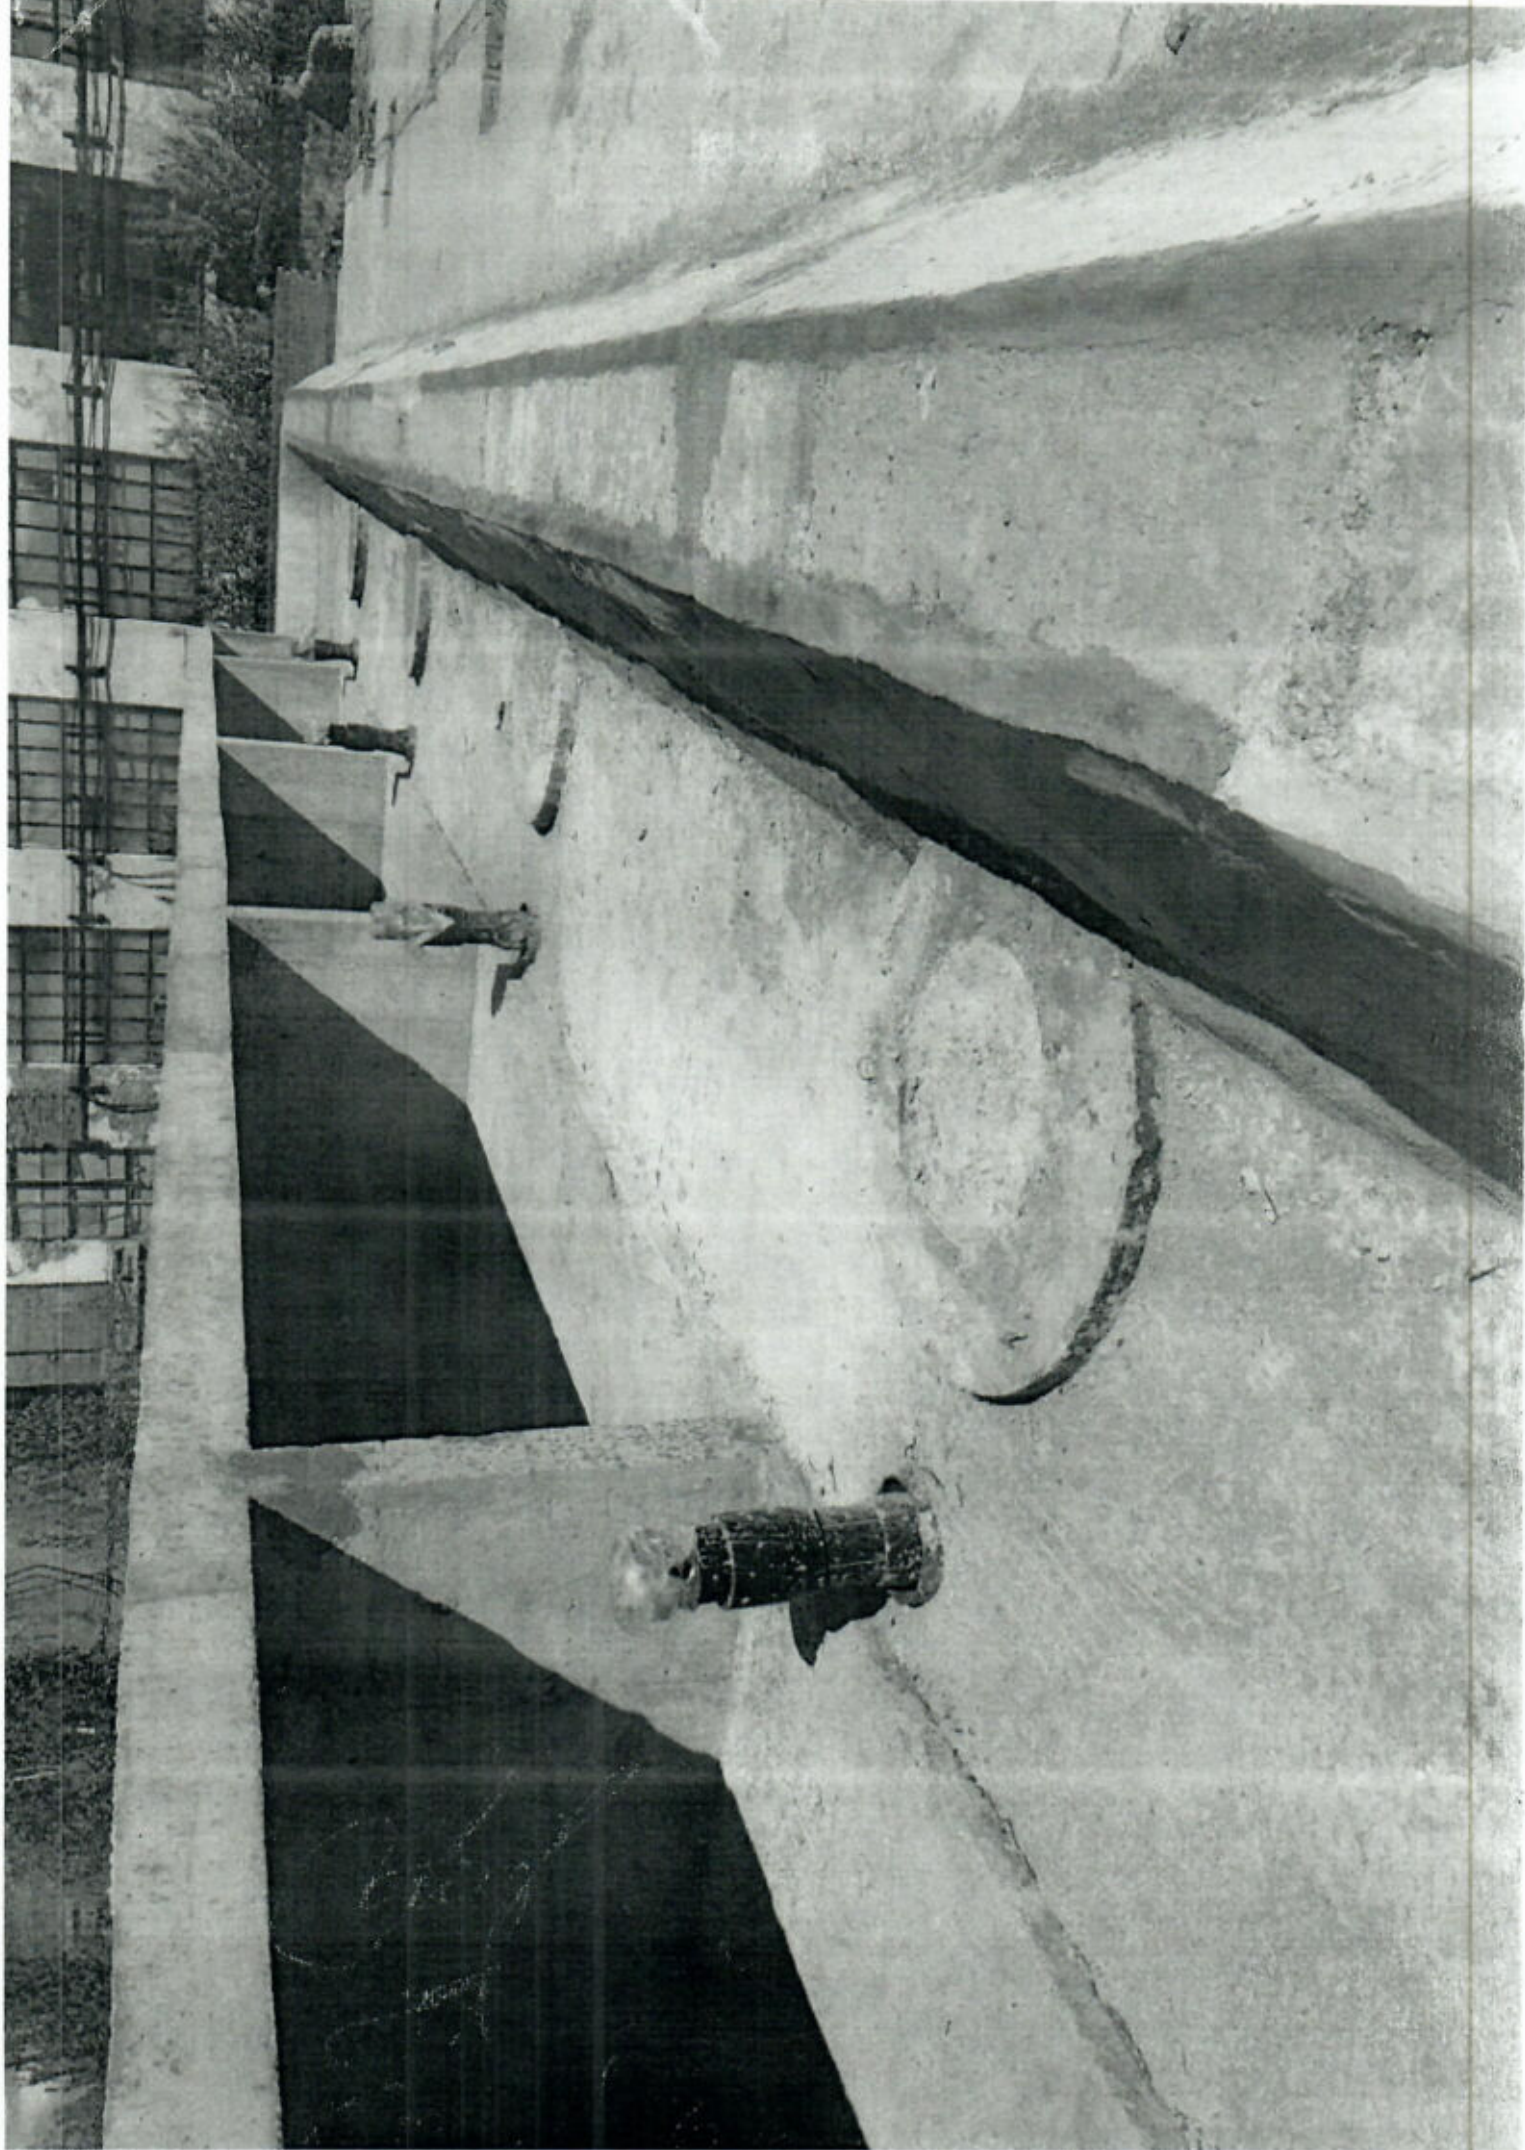

13.05.

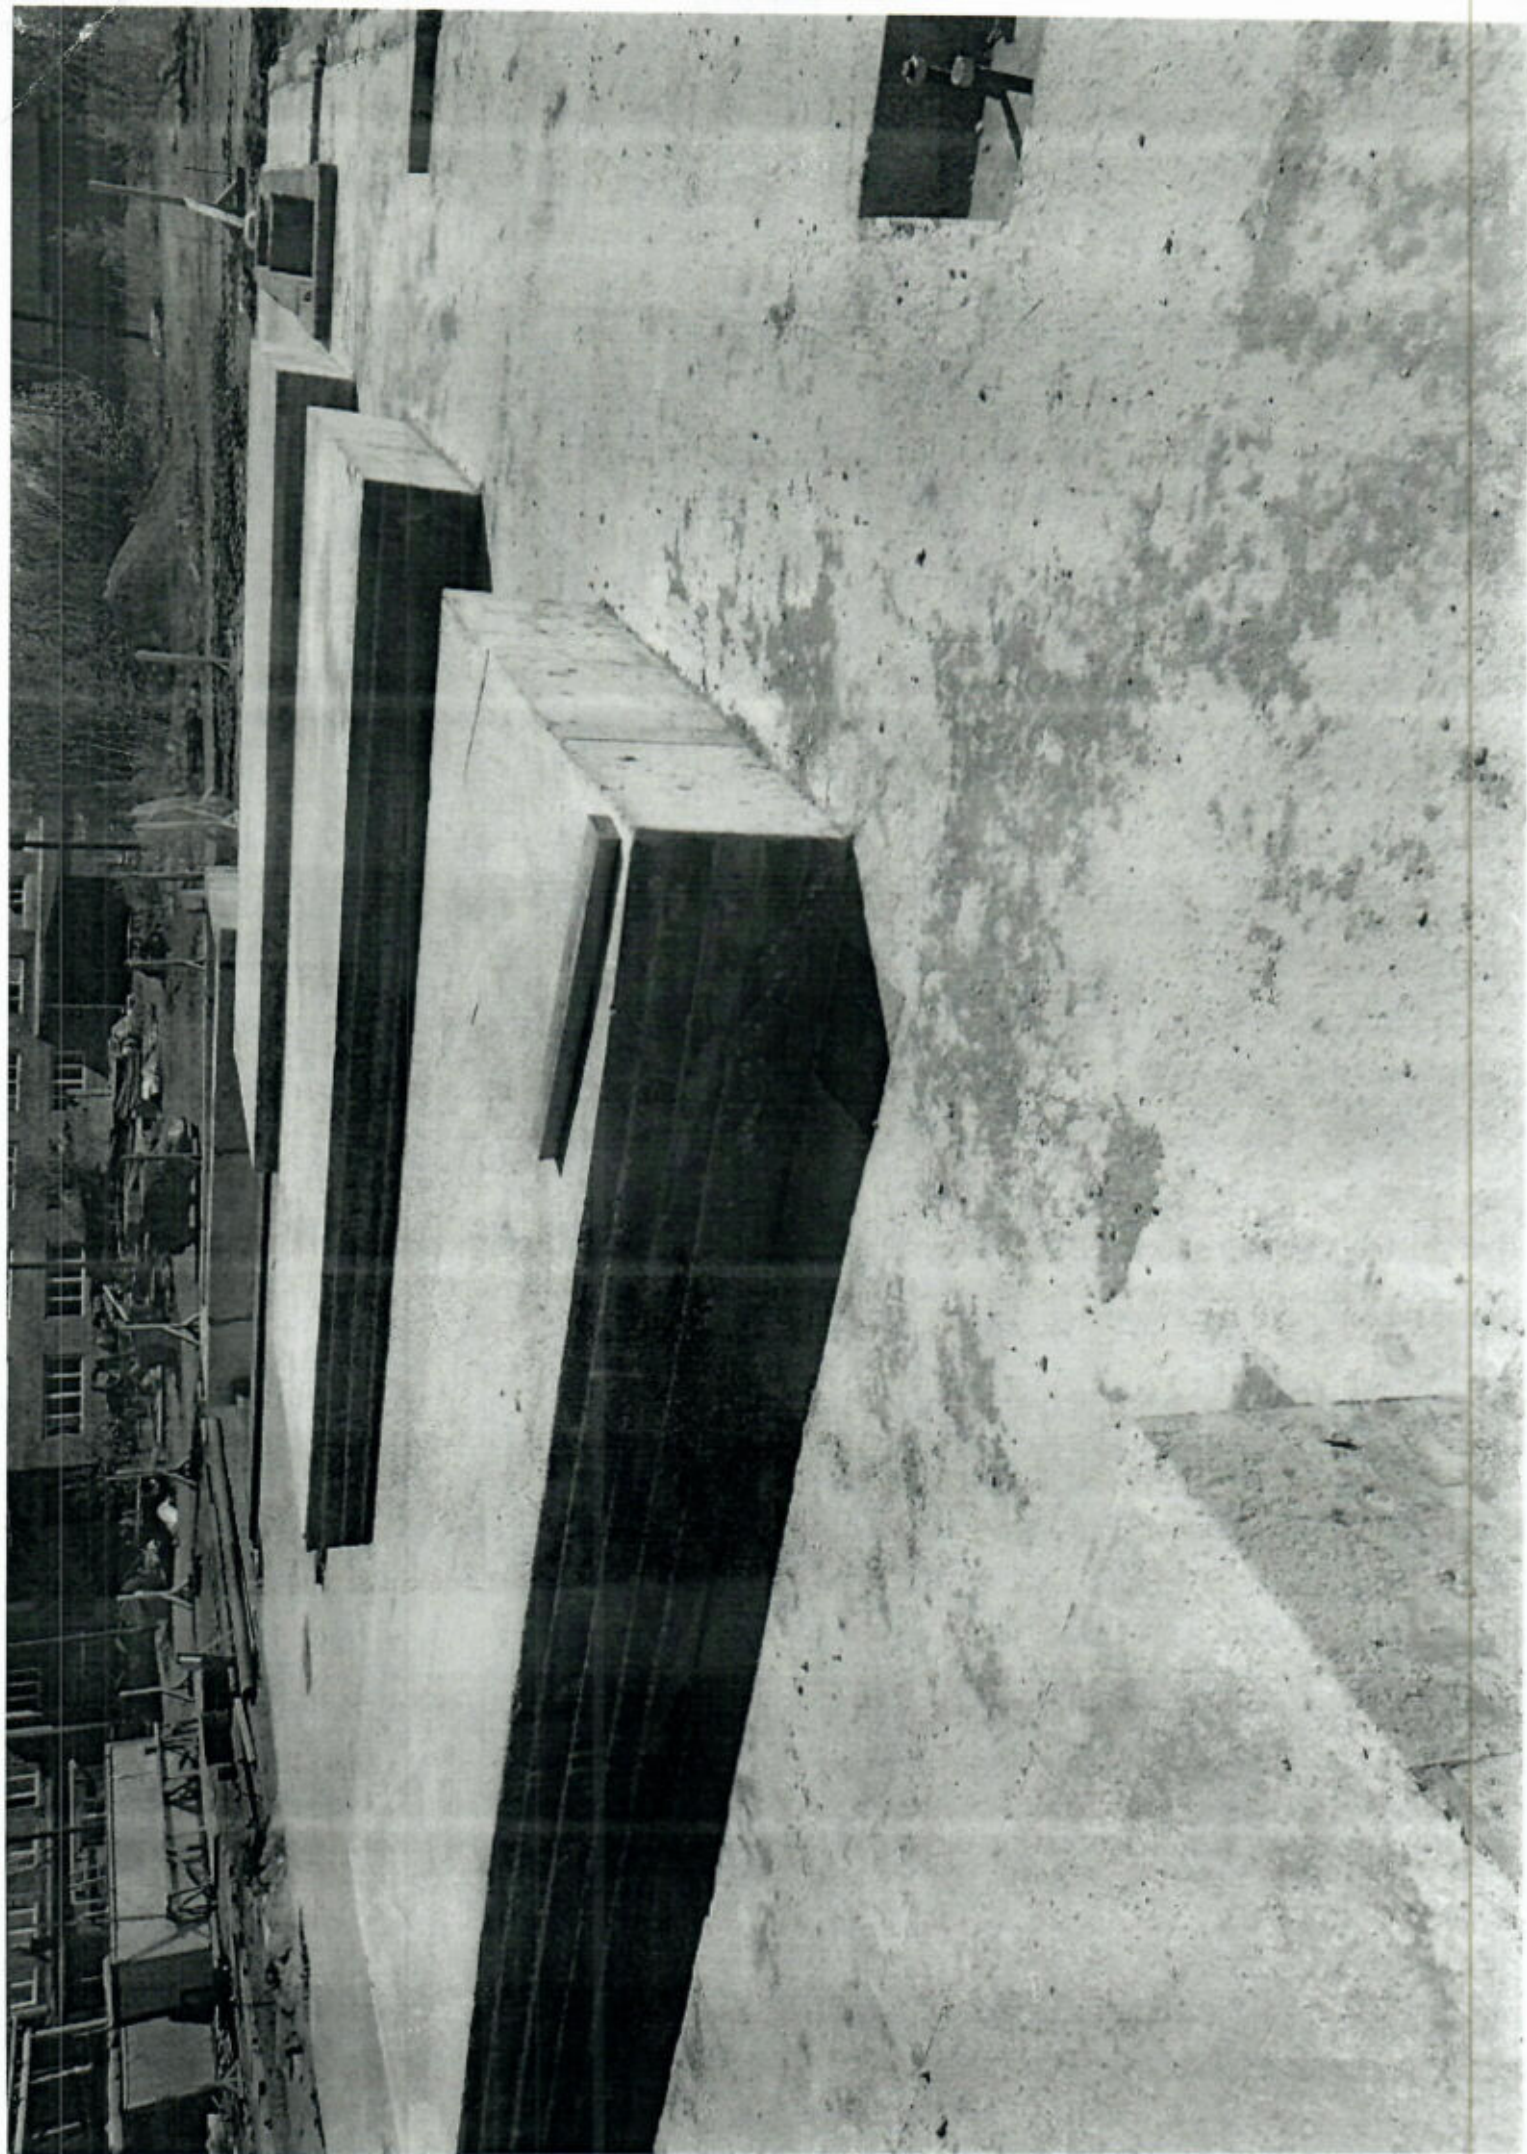

18.05"



12.05

Акт обследования

город Ясногорск

«22» мая 2020 года

Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Хряпкин А. А. – начальник отдела административно – технического надзора администрации муниципального образования Ясногорский район

Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

В ходе обследования установлено, что по состоянию на 22.05.2020 завершены фундаментные работы, ведутся подготовительные работы для монтажа металлоконструкций.

Выводы: нарушение сроков строительства новой блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт с последующим выводом из эксплуатации существующей котельной Центральная

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:

 М. О. Булдина

 А. А. Хряпкин

 Ю. А. Телков

 АО «РГК-1»  Держаков В.В.



22.05



22.05

АКТ
Проверки окончания этапа работ по строительству
№ _____

Г. Ясногорск

29.05.2020г.

Наименование объекта: *«Газовая котельная, расположенная по адресу: Тульская область, г. Ясногорск, ул. Заводская 3».*

Место проведения работ: *Тульская область, г. Ясногорск, ул. Заводская 3*

Комиссия в составе:

Представители от заказчика:

Заместитель директора по капитальному строительству ООО «РГК-Тула» Вебер Н. Н.

Начальник отдела капитального строительства ООО «РГК-1» Груздев О. В.

Представитель от подрядчика:

Главный инженер ООО «Экострой»

Еремеев И. В.

Представитель от администрации:

Заместитель председателя комитета жизнеобеспечения

АМО Ясногорский район

Телков Ю. А.

В результате проверки установили:

1. Не выполнена гидроизоляция фундамента ФМ6 в полном объёме;
2. Отсутствует трап на системе водоотведения КЗ-6;
3. Имеются недостатки в приемке П6;
4. Не смонтированы приёмные воронки на «слив с баков запаса воды»;
5. Не выполнена гидроизоляцию футляров установленных на трубопроводе «слива с баков запаса воды»;
6. Имеются недостатки утепления цоколя, не выполнена гидроизоляцию швов;
7. Фундаментные болты и закладные детали имеют отклонения и деформации;
8. Не заполнены швы в кладке «бункера для хранения мокрой соли»;
9. Не убран строительный мусор с территории площадки.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представители от заказчика:

Заместитель директора

по капитальному строительству ООО «РГК-Тула»

Вебер Н. Н.

Начальник отдела

капитального строительства ООО «РГК-1»

Груздев О. В.

Представитель от подрядчика:

Главный инженер ООО «Экострой»

Еремеев И. В.

Представитель от администрации:

Заместитель председателя комитета жизнеобеспечения

АМО Ясногорский район

Телков Ю. А.

Акт обследования

город Ясногорск

«03» июля 2020 года

Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;
Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;
Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район




Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

В ходе обследования установлено, что по состоянию на 03.07.2020 выполнены следующие работы: земляные работы, фундаменты, приямки, цоколь, внутренняя канализация.

Выводы: нарушение сроков строительства новой блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт с последующим выводом из эксплуатации существующей котельной Центральная

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:


_____ Ю. А. Телков

_____ М. О. Булдина

_____ Н. А. Трубина

АО «РГК-1»  *Бабанов В.В.*





Акт обследования

город Ясногорск

«02» сентября 2020 года

Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район

Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

В ходе обследования установлено, что по состоянию на 02.09.2020 полностью выполнены бетонные работы по заливке нулевого цикла, произведен монтаж внутренней канализации.


АО «РГК-1» проведена корректировка проекта с учетом изменившегося поставщика оборудования, объявлен конкурс по выбору подрядчика для монтажа металлоконструкций основного здания котельной, объявлен конкурс на определение генерального подрядчика, заключен договор на поставку металлоконструкций.

Выводы: нарушение сроков строительства новой блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт с последующим выводом из эксплуатации существующей котельной Центральная

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:

 М. О. Булдина

 Н. А. Трубина

АО «РГК-1»  Иванова В.В.







АКТ
КОМИССИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

« 28 » « октября » 2020

г.Ясногорск

Комиссия в составе:

Булдина М.О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю.А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Рубанова Е.И. – инженер-сметчик.

Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская,3 г.Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

В ходе обследования установлено, что по состоянию на 28.10.2020 года полностью выполнены фундаментные работы, к монтажу металлических конструкций не приступали.

Выводы: нарушение сроков строительства новой блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт.


К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:

Булдина М.О.

Телков Ю.А.

Рубанова Е.И.













АКТ
КОМИССИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

« 06 » « ноября » 2020

г.Ясногорск

Комиссия в составе:

Булдина М.О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю.А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Рубанова Е.И. – инженер-сметчик.

Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская,3 г.Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

В ходе обследования установлено, что по состоянию на 06.11.2020 года полностью выполнены фундаментные работы, к монтажу металлических конструкций не приступали.

Выводы: нарушение сроков строительства новой блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт.


К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:

Булдина М.О.

Телков Ю.А.

Рубанова Е.И.

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are cursive and correspond to the names listed to the left: Buldina M.O., Telkov Yu.A., and Rubanova E.I.

Акт обследования

город Ясногорск

«24» ноября 2020 года

Комиссия в составе:


Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;
Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;
Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район

Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*


В ходе обследования установлено, что по состоянию на 24.11.2020 ведутся работы по обвязке колонн новой блочно-модульной котельной.

К акту приобщено: фотоматериал.


Подписи:



М. О. Булдина



Ю. А. Телков



Н. А. Трубина

Тема **Фото от Дмитрий Попов**
От Попов Дмитрий <dmitruf@gmail.com>
Кому Комитет жизнеобеспечения <mo.yasnogorsk.gkh@tularegion.org>
Дата 2020-11-24 10:43




Скачайте [Outlook для Android](#)

Тема **Фото от Дмитрий Попов**

От Попов Дмитрий <dmitruf@gmail.com>

Кому Комитет жизнеобеспечения <mo.yasnogorsk.gkh@tularegion.org>

Дата 2020-11-24 10:42

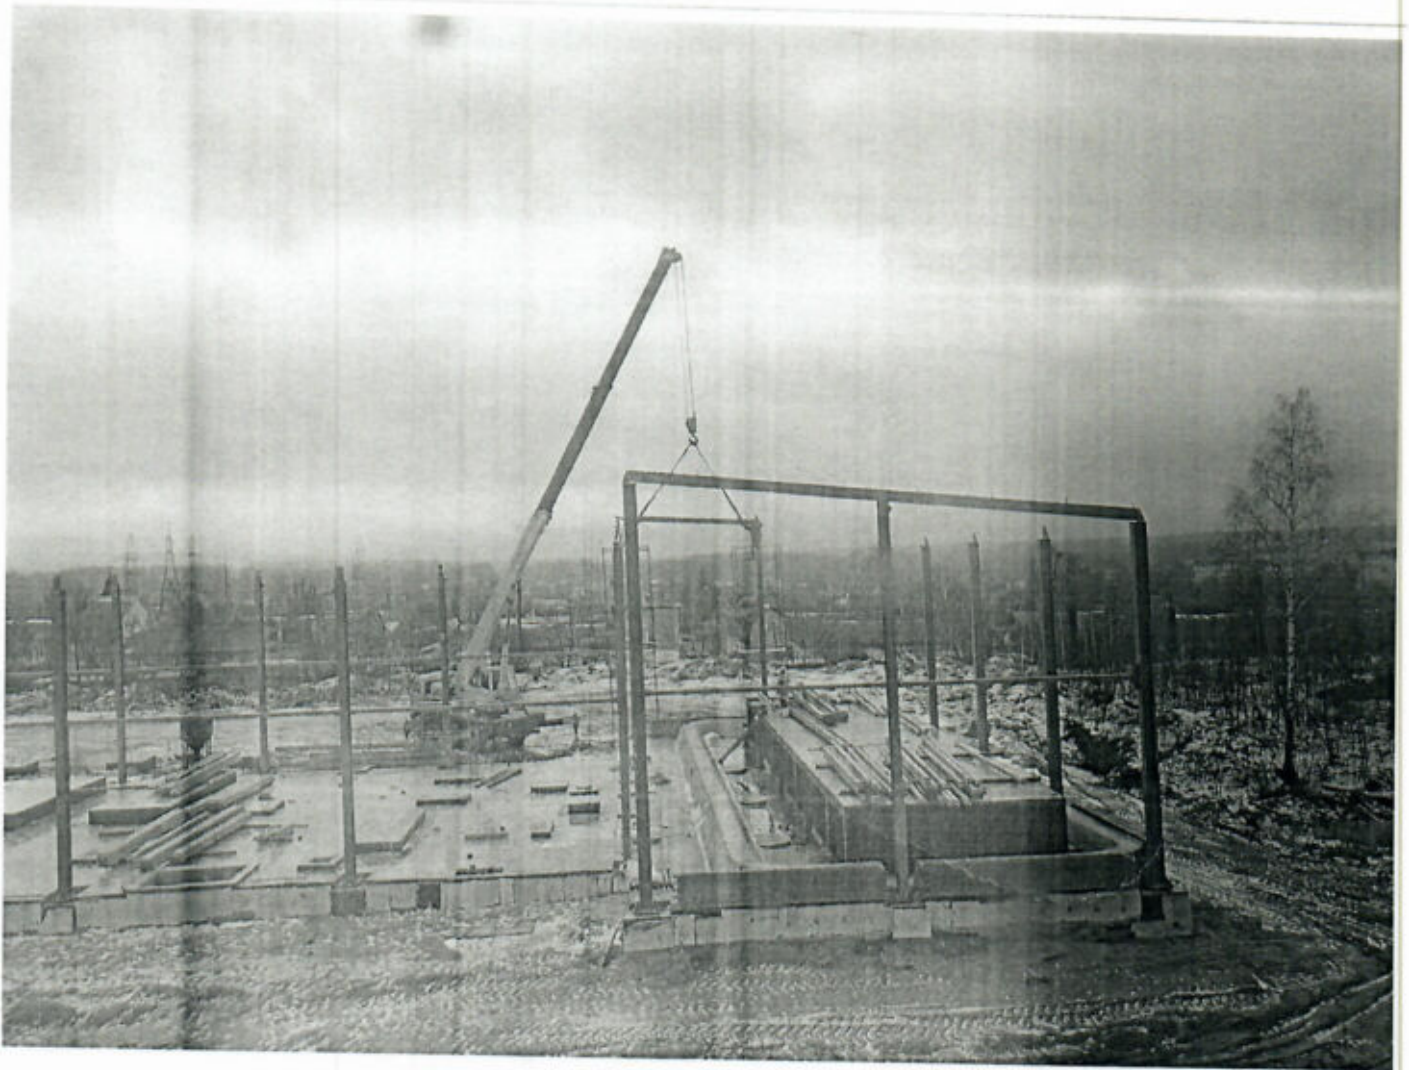

Скачайте [Outlook для Android](#)



Министру
жилищно-коммунального
хозяйства Тульской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЯСНОГОРСКИЙ РАЙОН

О.И.Дючкову

Адрес: 301030, Тульская область,
г. Ясногорск, ул. П. Смиловича, д. 8
тел./факс 4-02-89
ased_mo_yasnogorsk@tularegion.ru
от 13.11.20 № 9676
На 06-01-01/840 от 16.11.2020

Уважаемый Олег Иванович!

Во исполнение п. 01 подпункта 1.4.2.3 перечня поручений по итогам совещания от 03.11.2020 №136 сообщаю следующее.

По информации, предоставленной АО №РГК-1», в настоящее время ведутся работы по обвязке колонн новой котельной «Центральная».

Приложение: фотоматериалы по ходу работ на 4 листах.

С уважением,
глава администрации
муниципального образования
Ясногорский район

В.В.Мухин

Исп. Булдина Марина Олеговна,
председатель комитета жизнеобеспечения,
тел.8 (48766)4-01-36

Акт обследования

город Ясногорск

«27» ноября 2020 года

Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;


Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район

Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*


В ходе обследования установлено, что по состоянию на 27.11.2020 ведутся работы по обвязке колонн новой блочно-модульной котельной.

К акту приобщено: фотоматериал.


Подписи:



М. О. Булдина



Ю. А. Телков



Н. А. Трубина



Акт обследования

город Ясногорск

«03» декабря 2020 года

Комиссия в составе:


Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;
Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;
Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район

Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*


В ходе обследования установлено, что по состоянию на 03.12.2020 ведутся работы по монтажу металлоконструкций каркаса здания новой блочно-модульной котельной.

К акту приобщено: фотоматериал.


Подписи:




М. О. Булдина



Ю. А. Телков





Н. А. Трубина

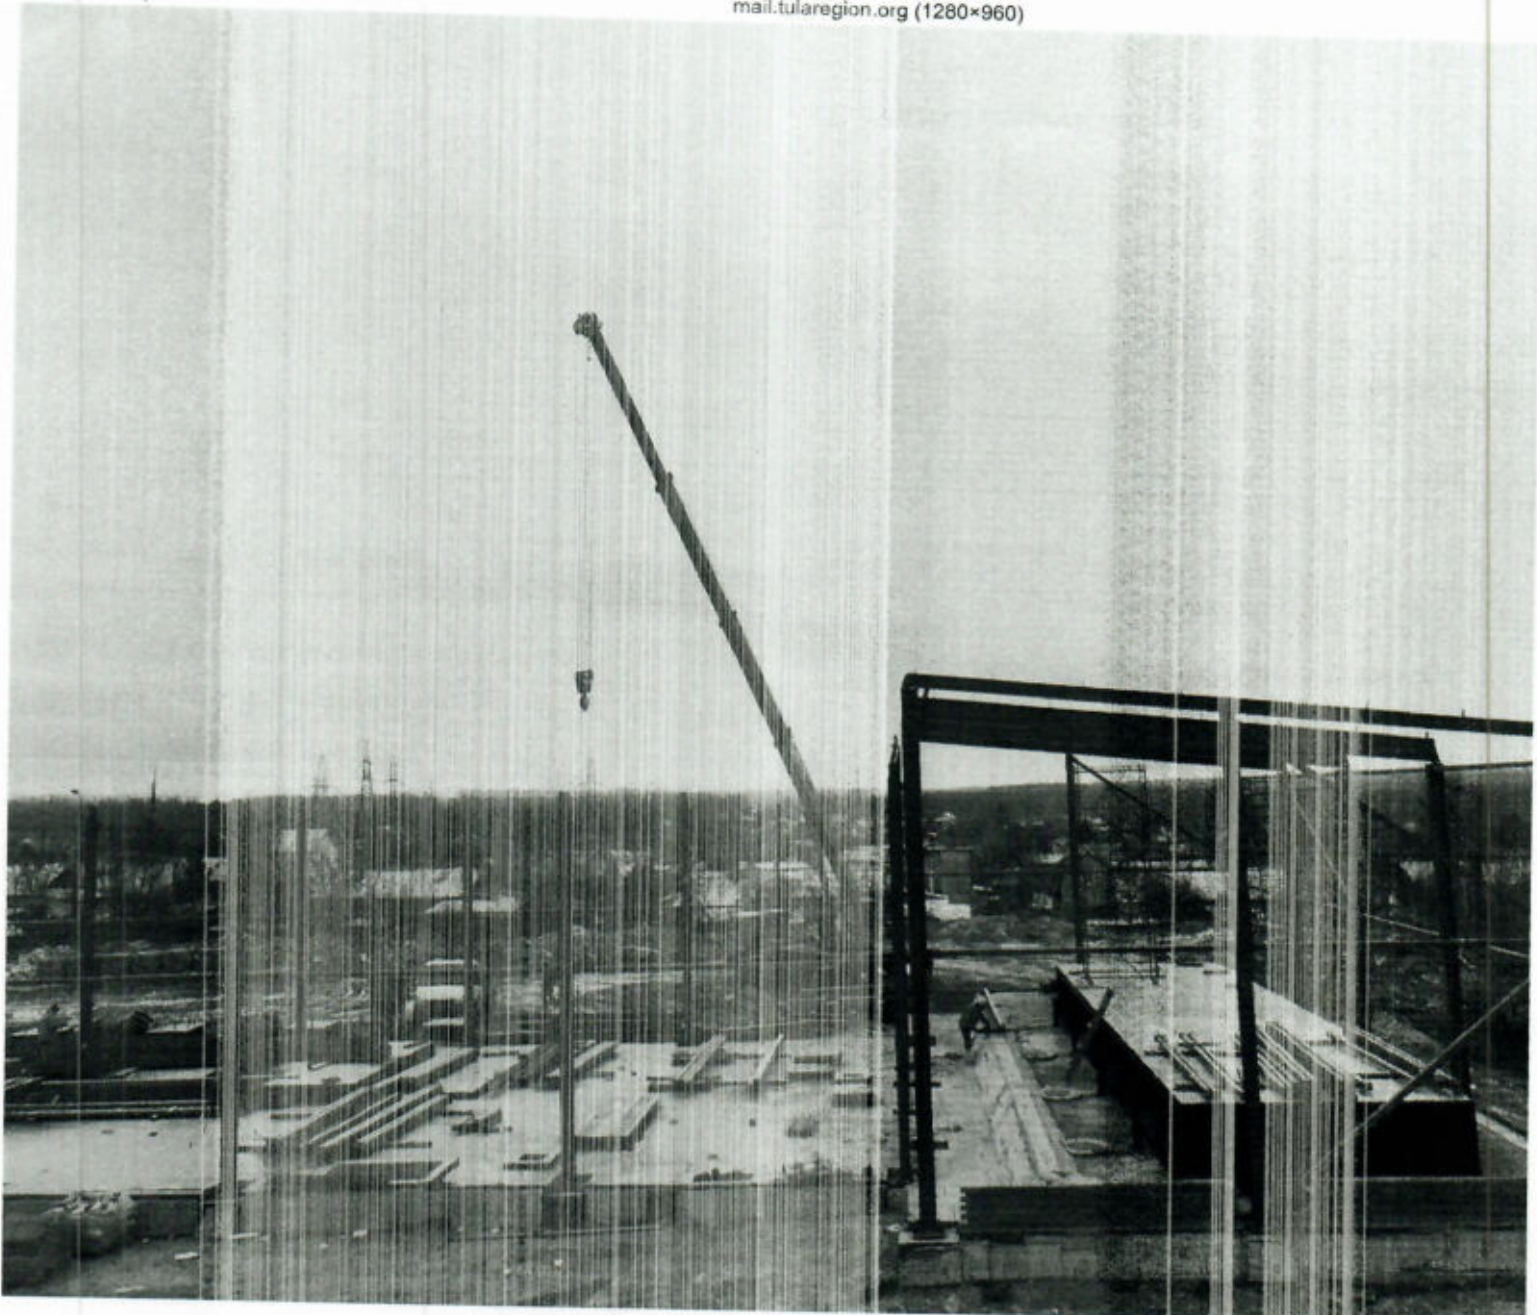

03.12.20

производство листов металлоконструкц.
цели каркаса здания

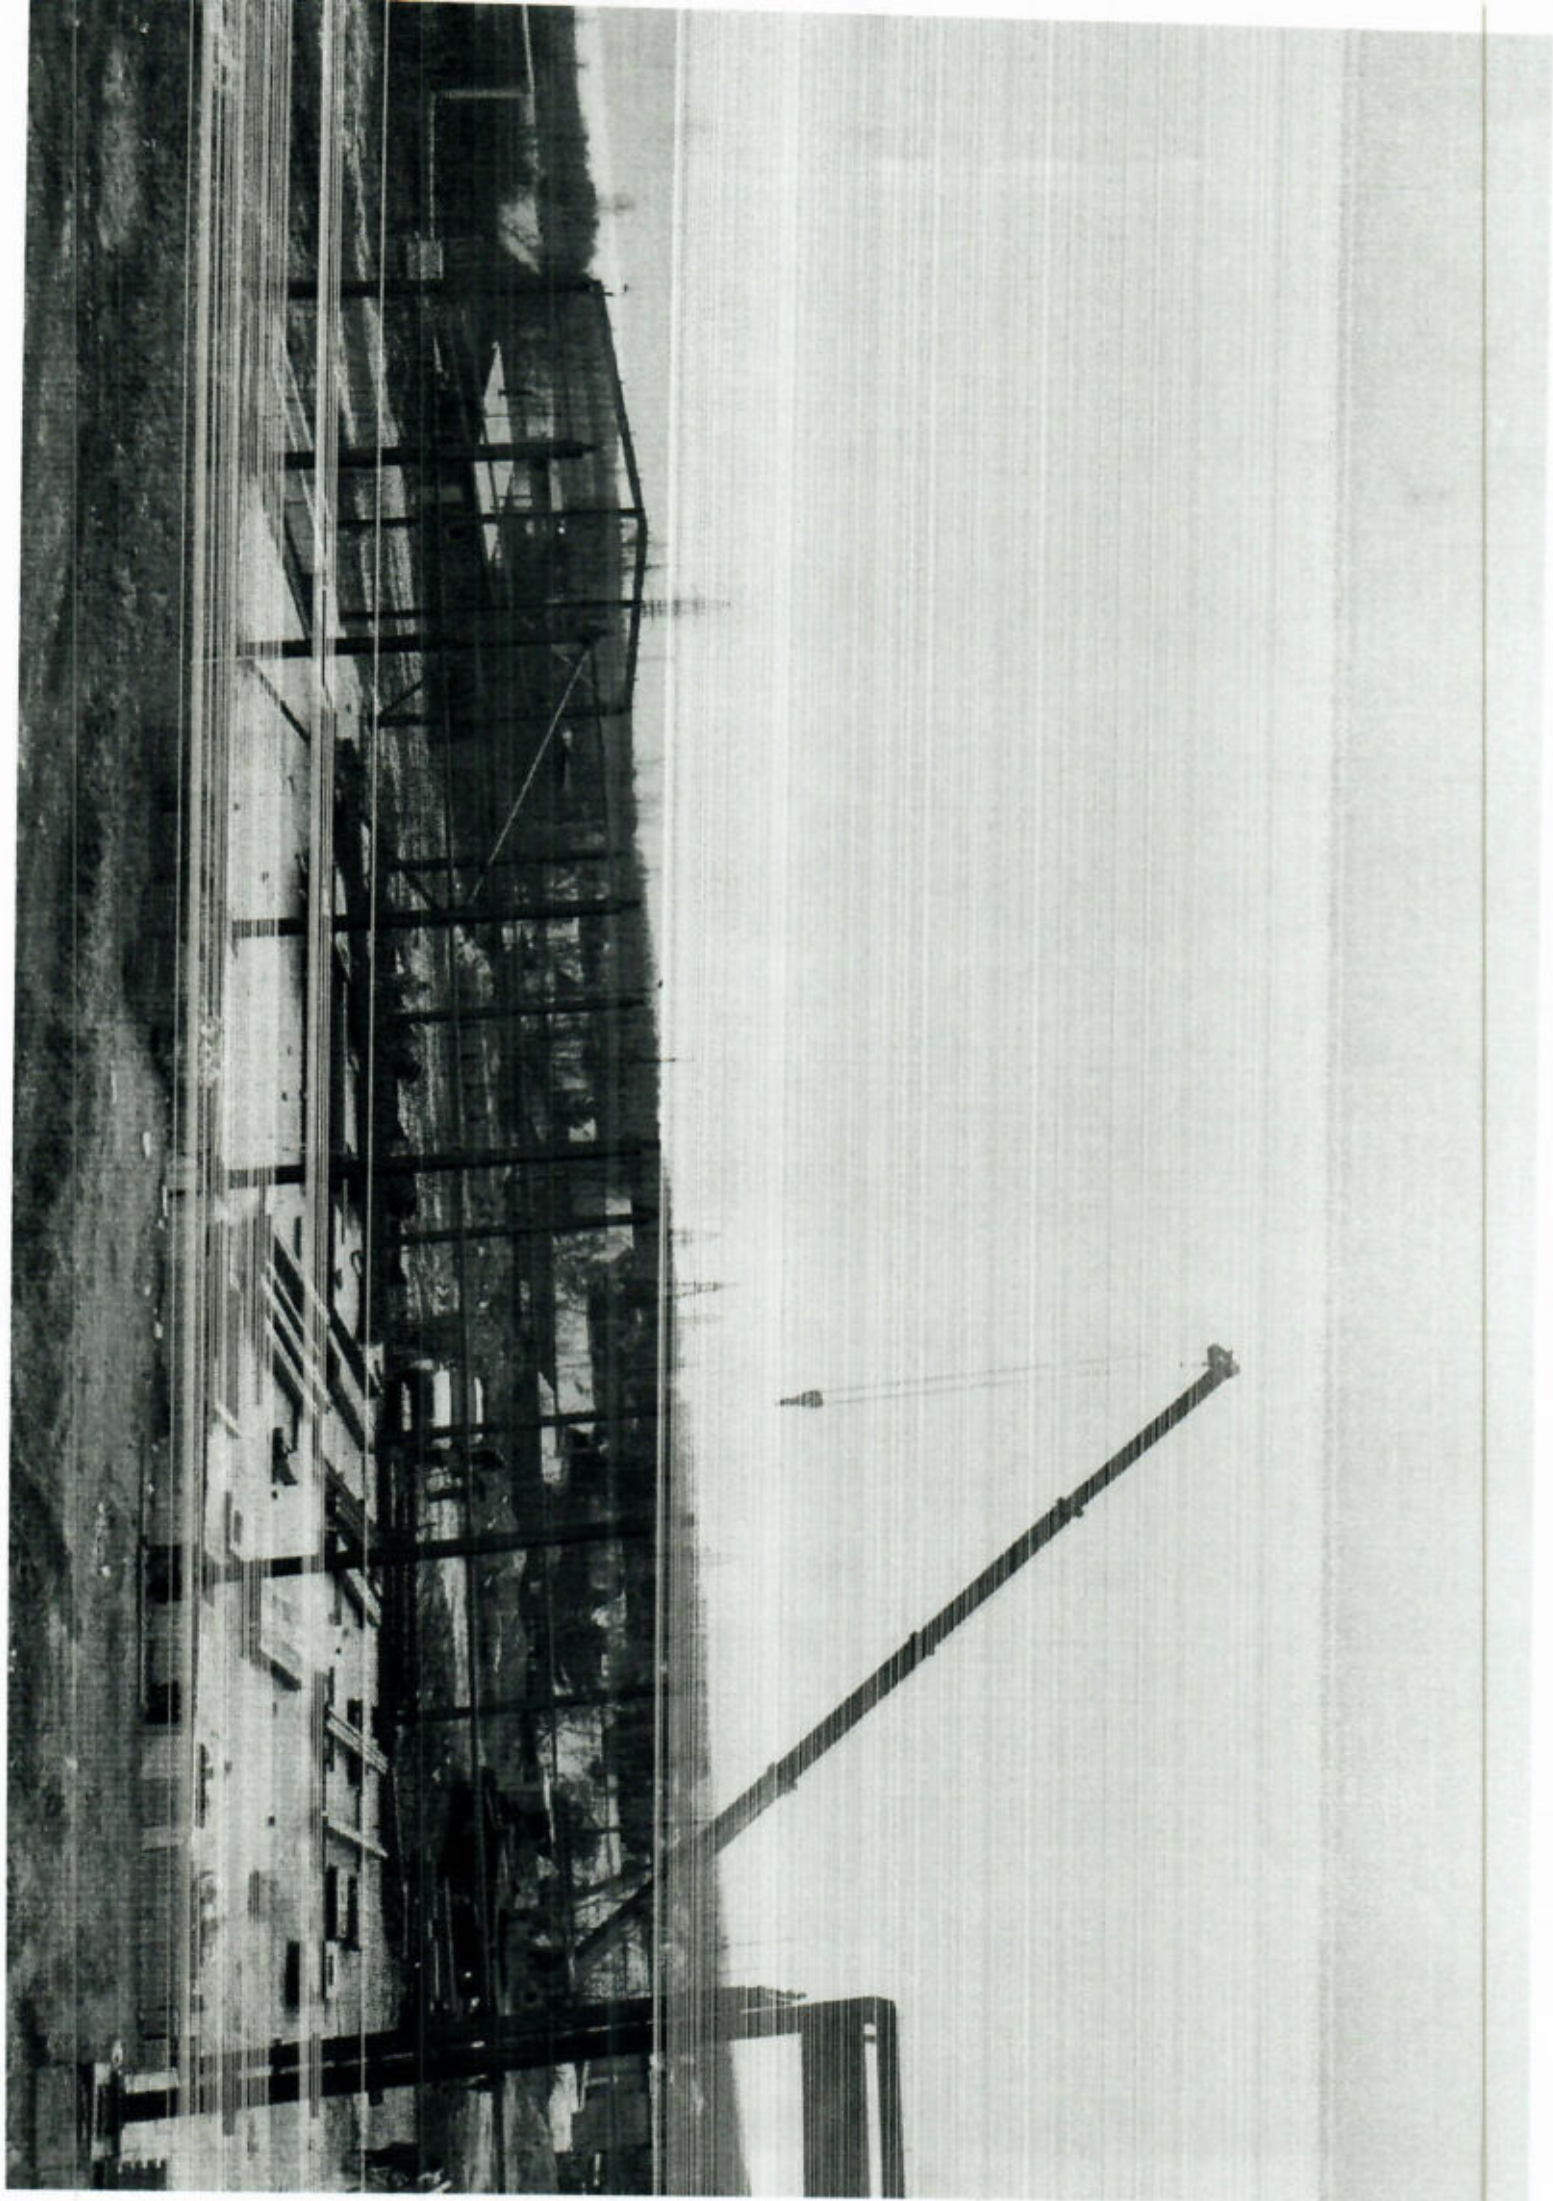

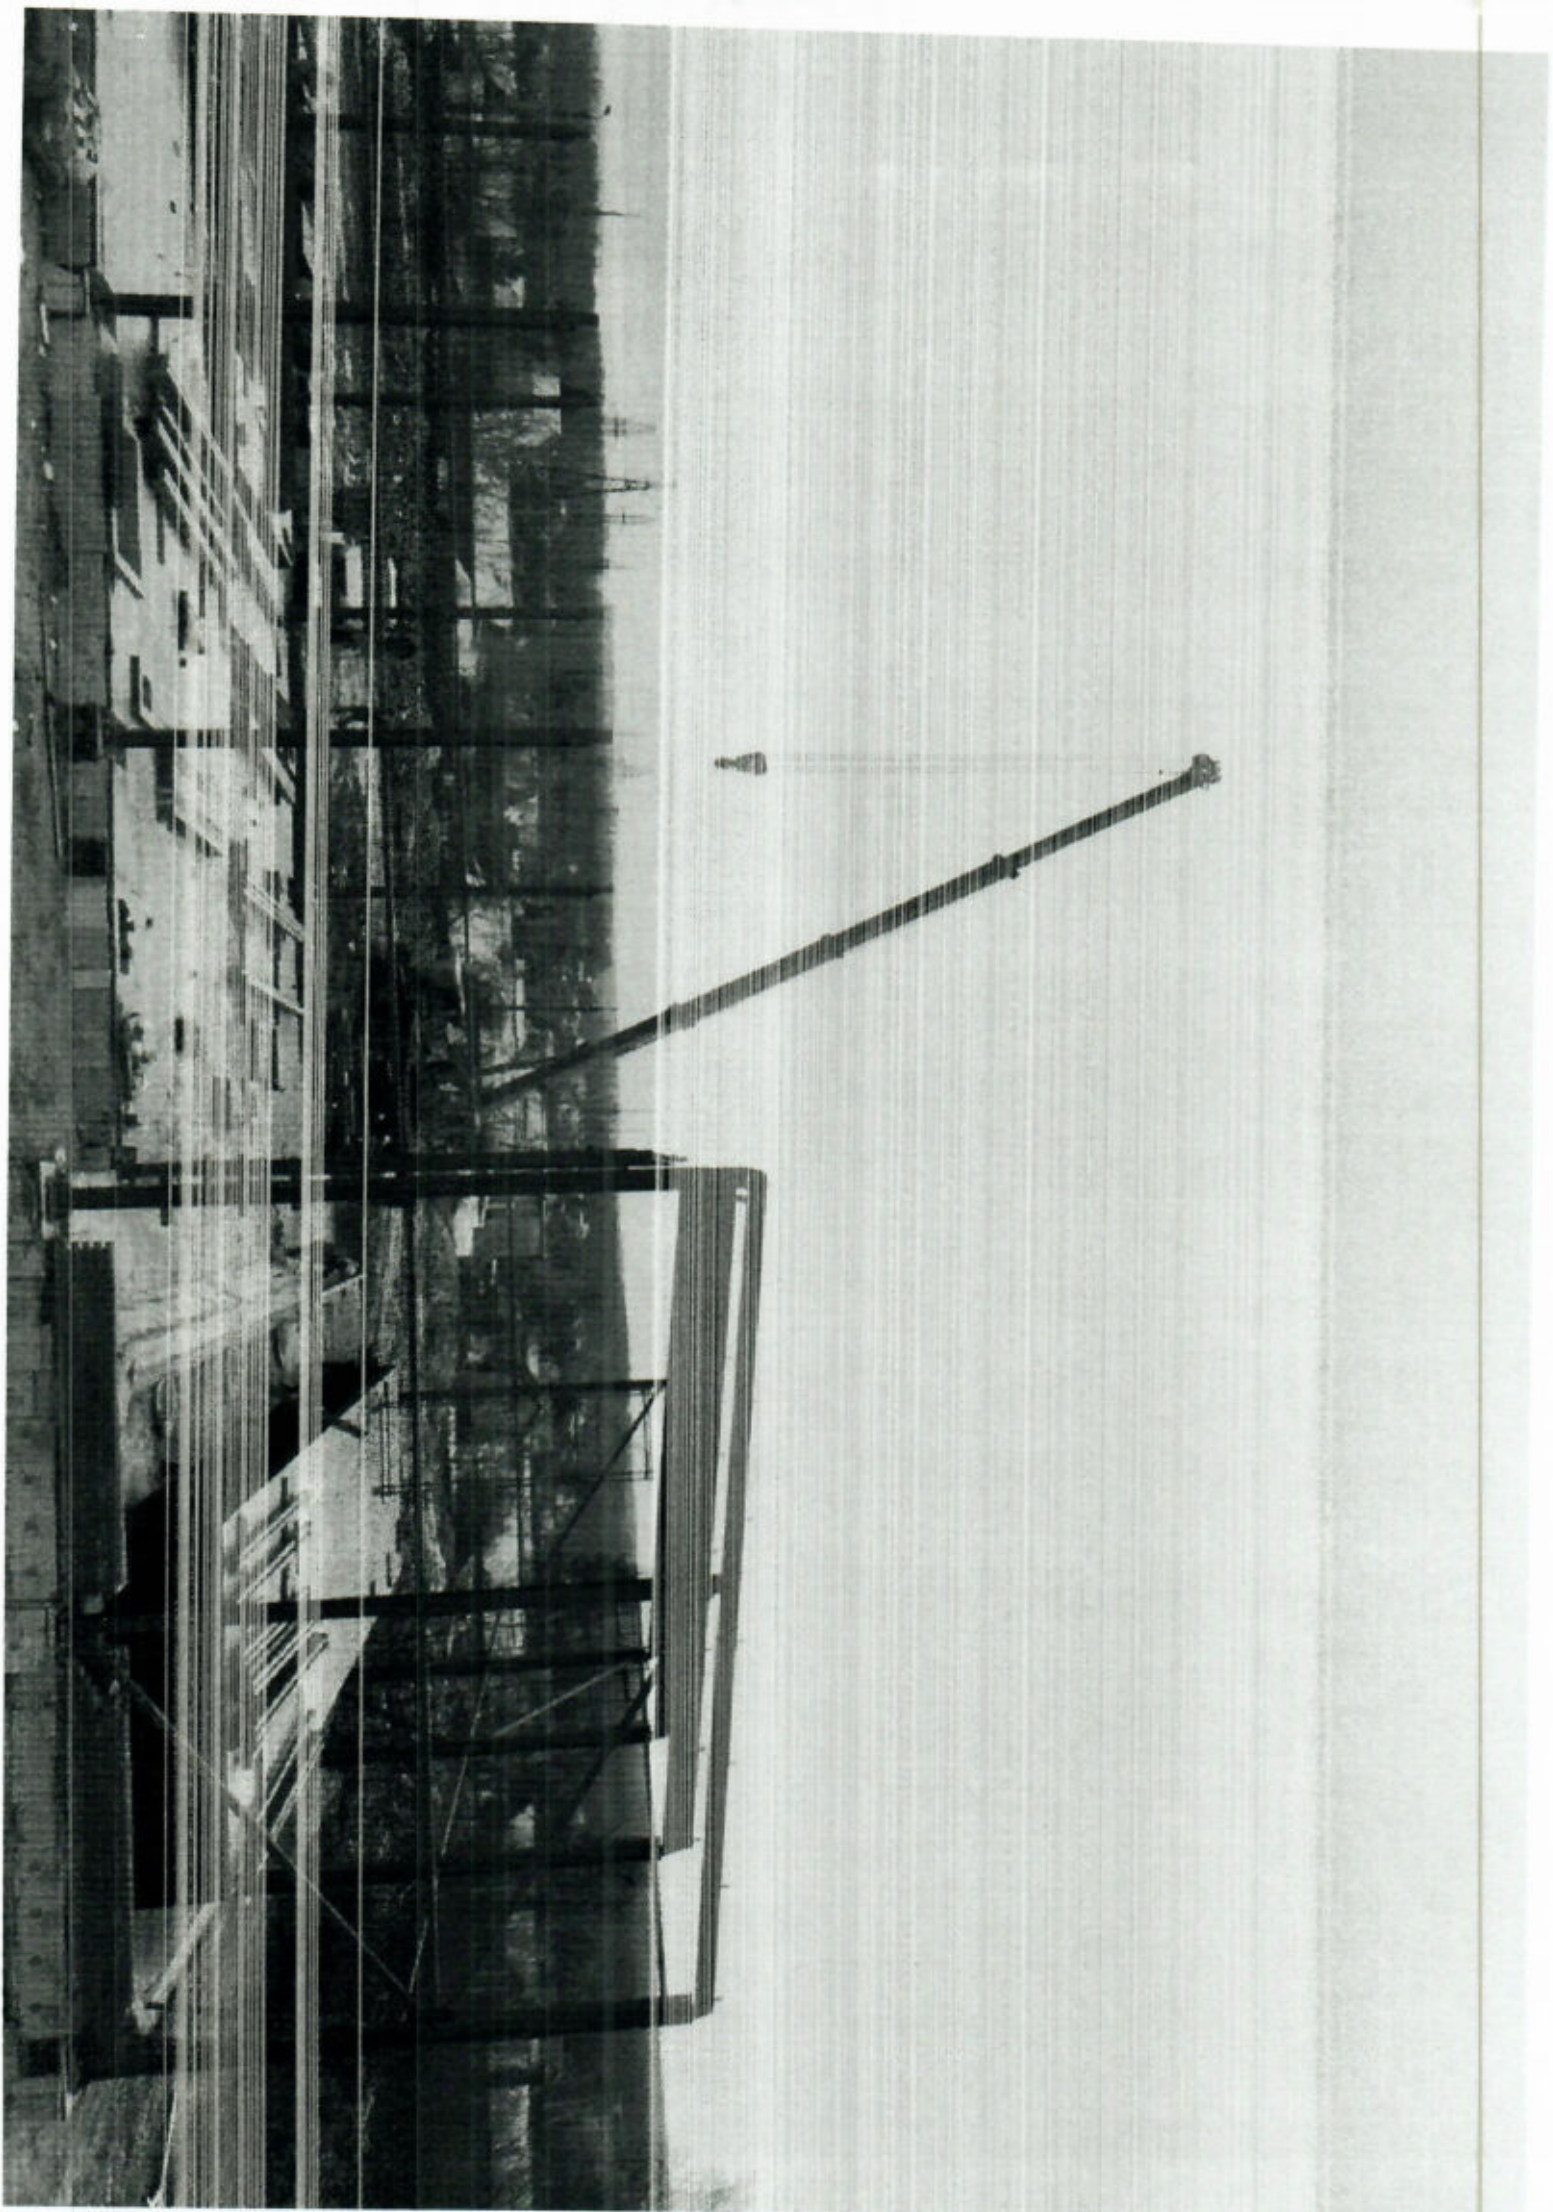

Акт обследования

город Ясногорск

«10» декабря 2020 года

Комиссия в составе:


Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;
Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;
Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район

Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*


В ходе обследования установлено, что по состоянию на 10.12.2020 ведутся работы по монтажу верхних перекрытий каркаса здания новой блочно-модульной котельной, на строительную площадку доставлен 1 котел.

К акту приобщено: фотоматериал.


Подписи:




М. О. Булдина



Ю. А. Телков




Н. А. Трубина

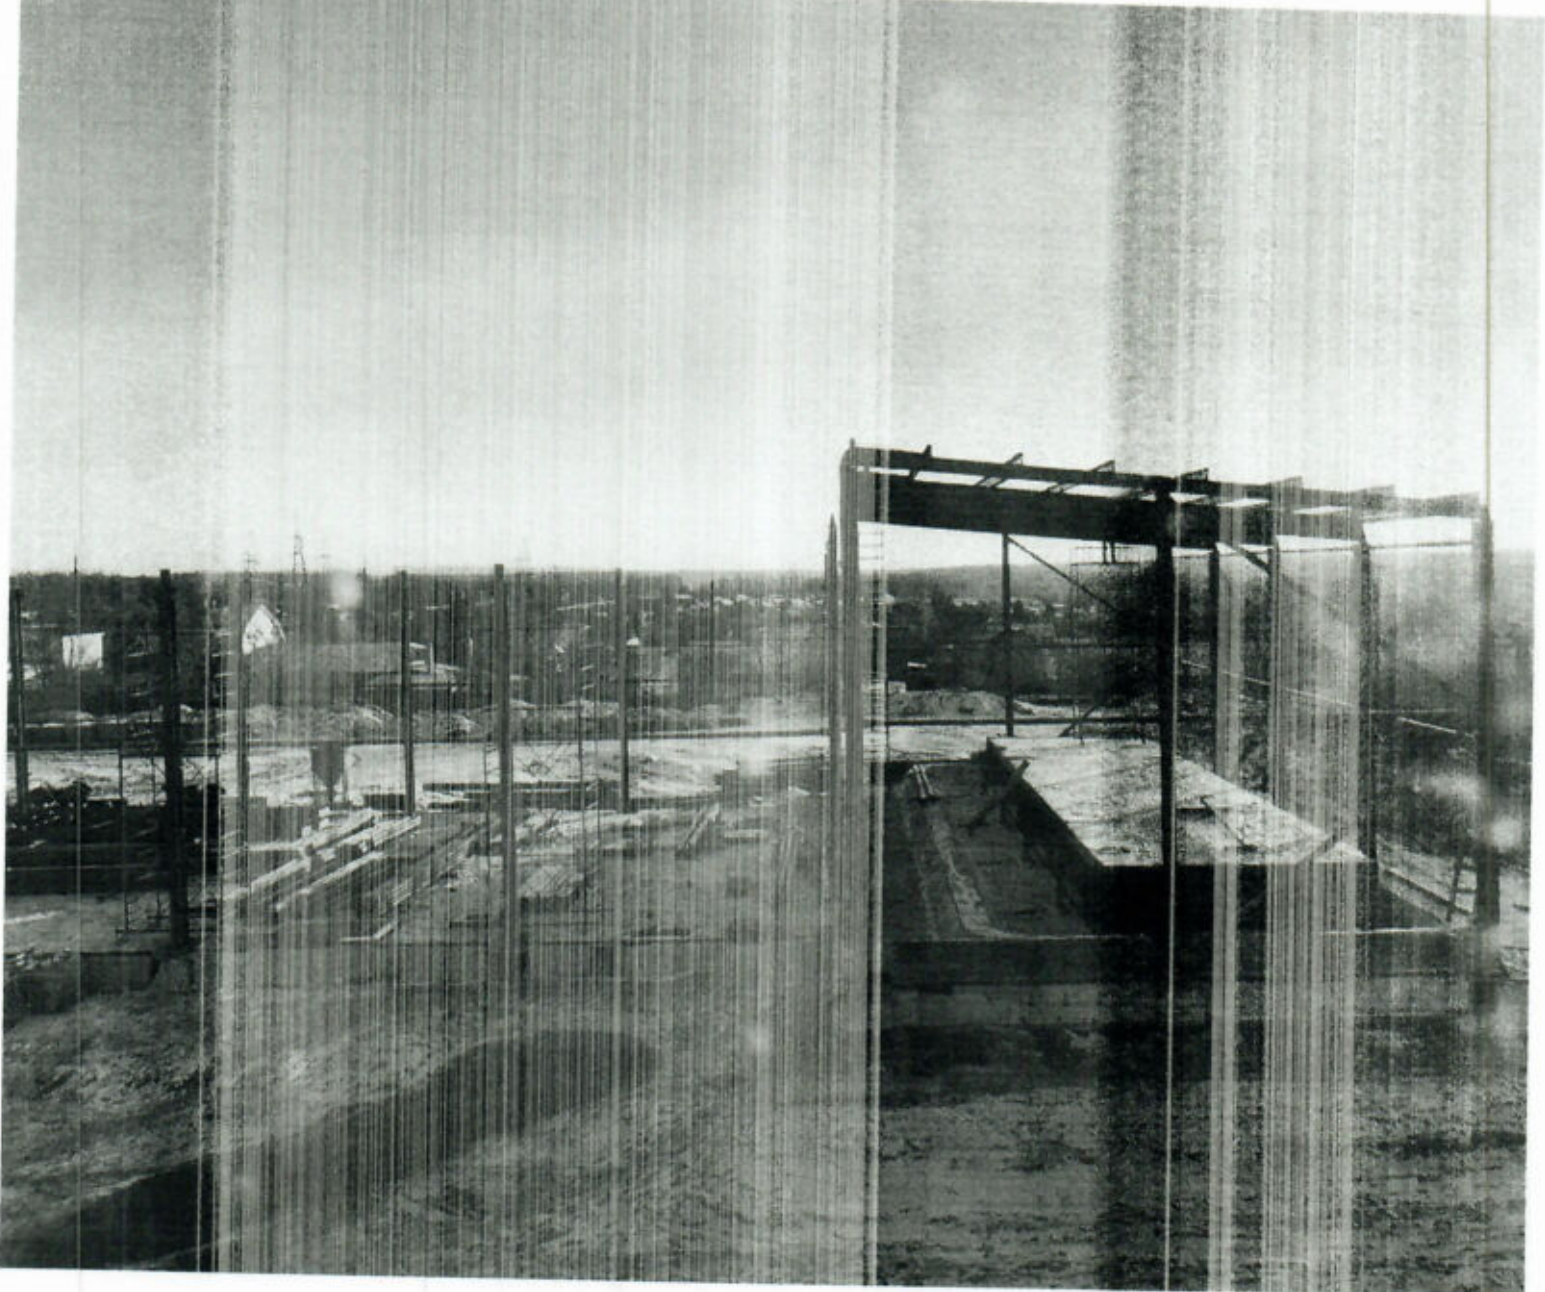





included 09.14.80

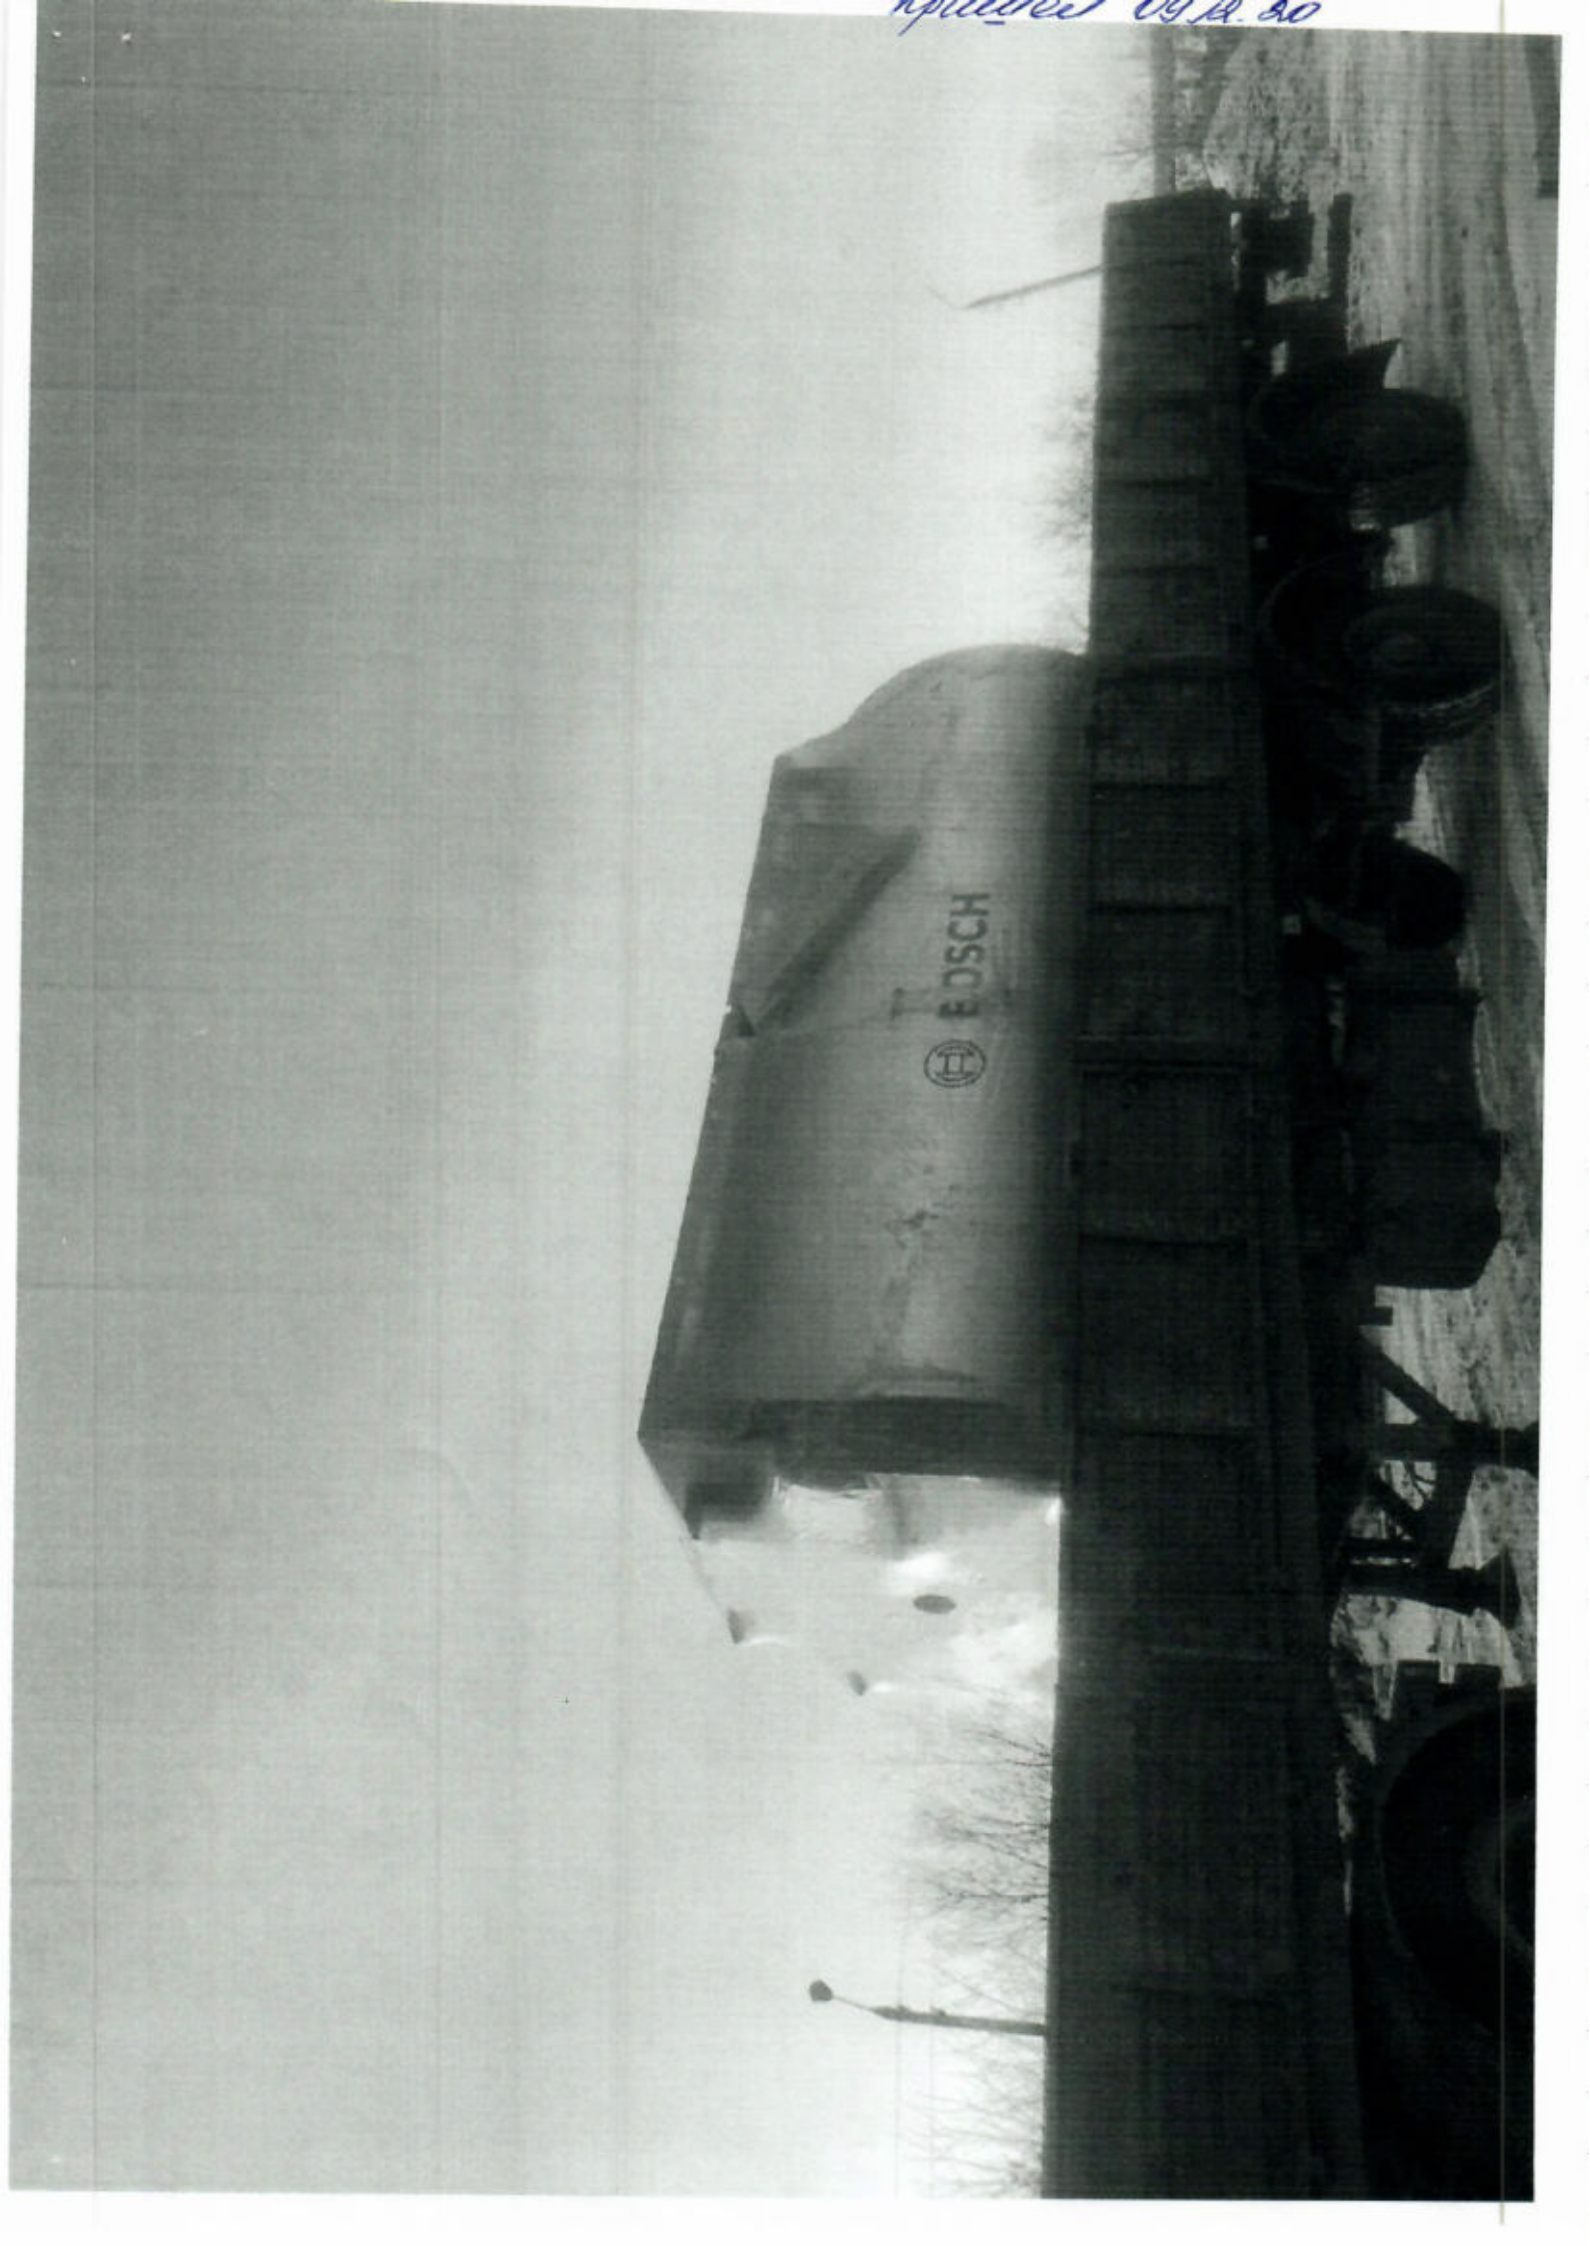

Акт обследования

город Ясногорск

«16» декабря 2020 года

Комиссия в составе:




Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;
Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;
Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район

Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

В ходе обследования установлено, что по состоянию на 16.12.2020 продолжаются работы по монтажу каркаса здания новой блочно-модульной котельной, на строительную площадку доставлены сэндвич-панели (кровельные и стеновые).

К акту приобщено: фотоматериал.


Подписи:

 М. О. Булдина
 Ю. А. Телков
 Н. А. Трубина







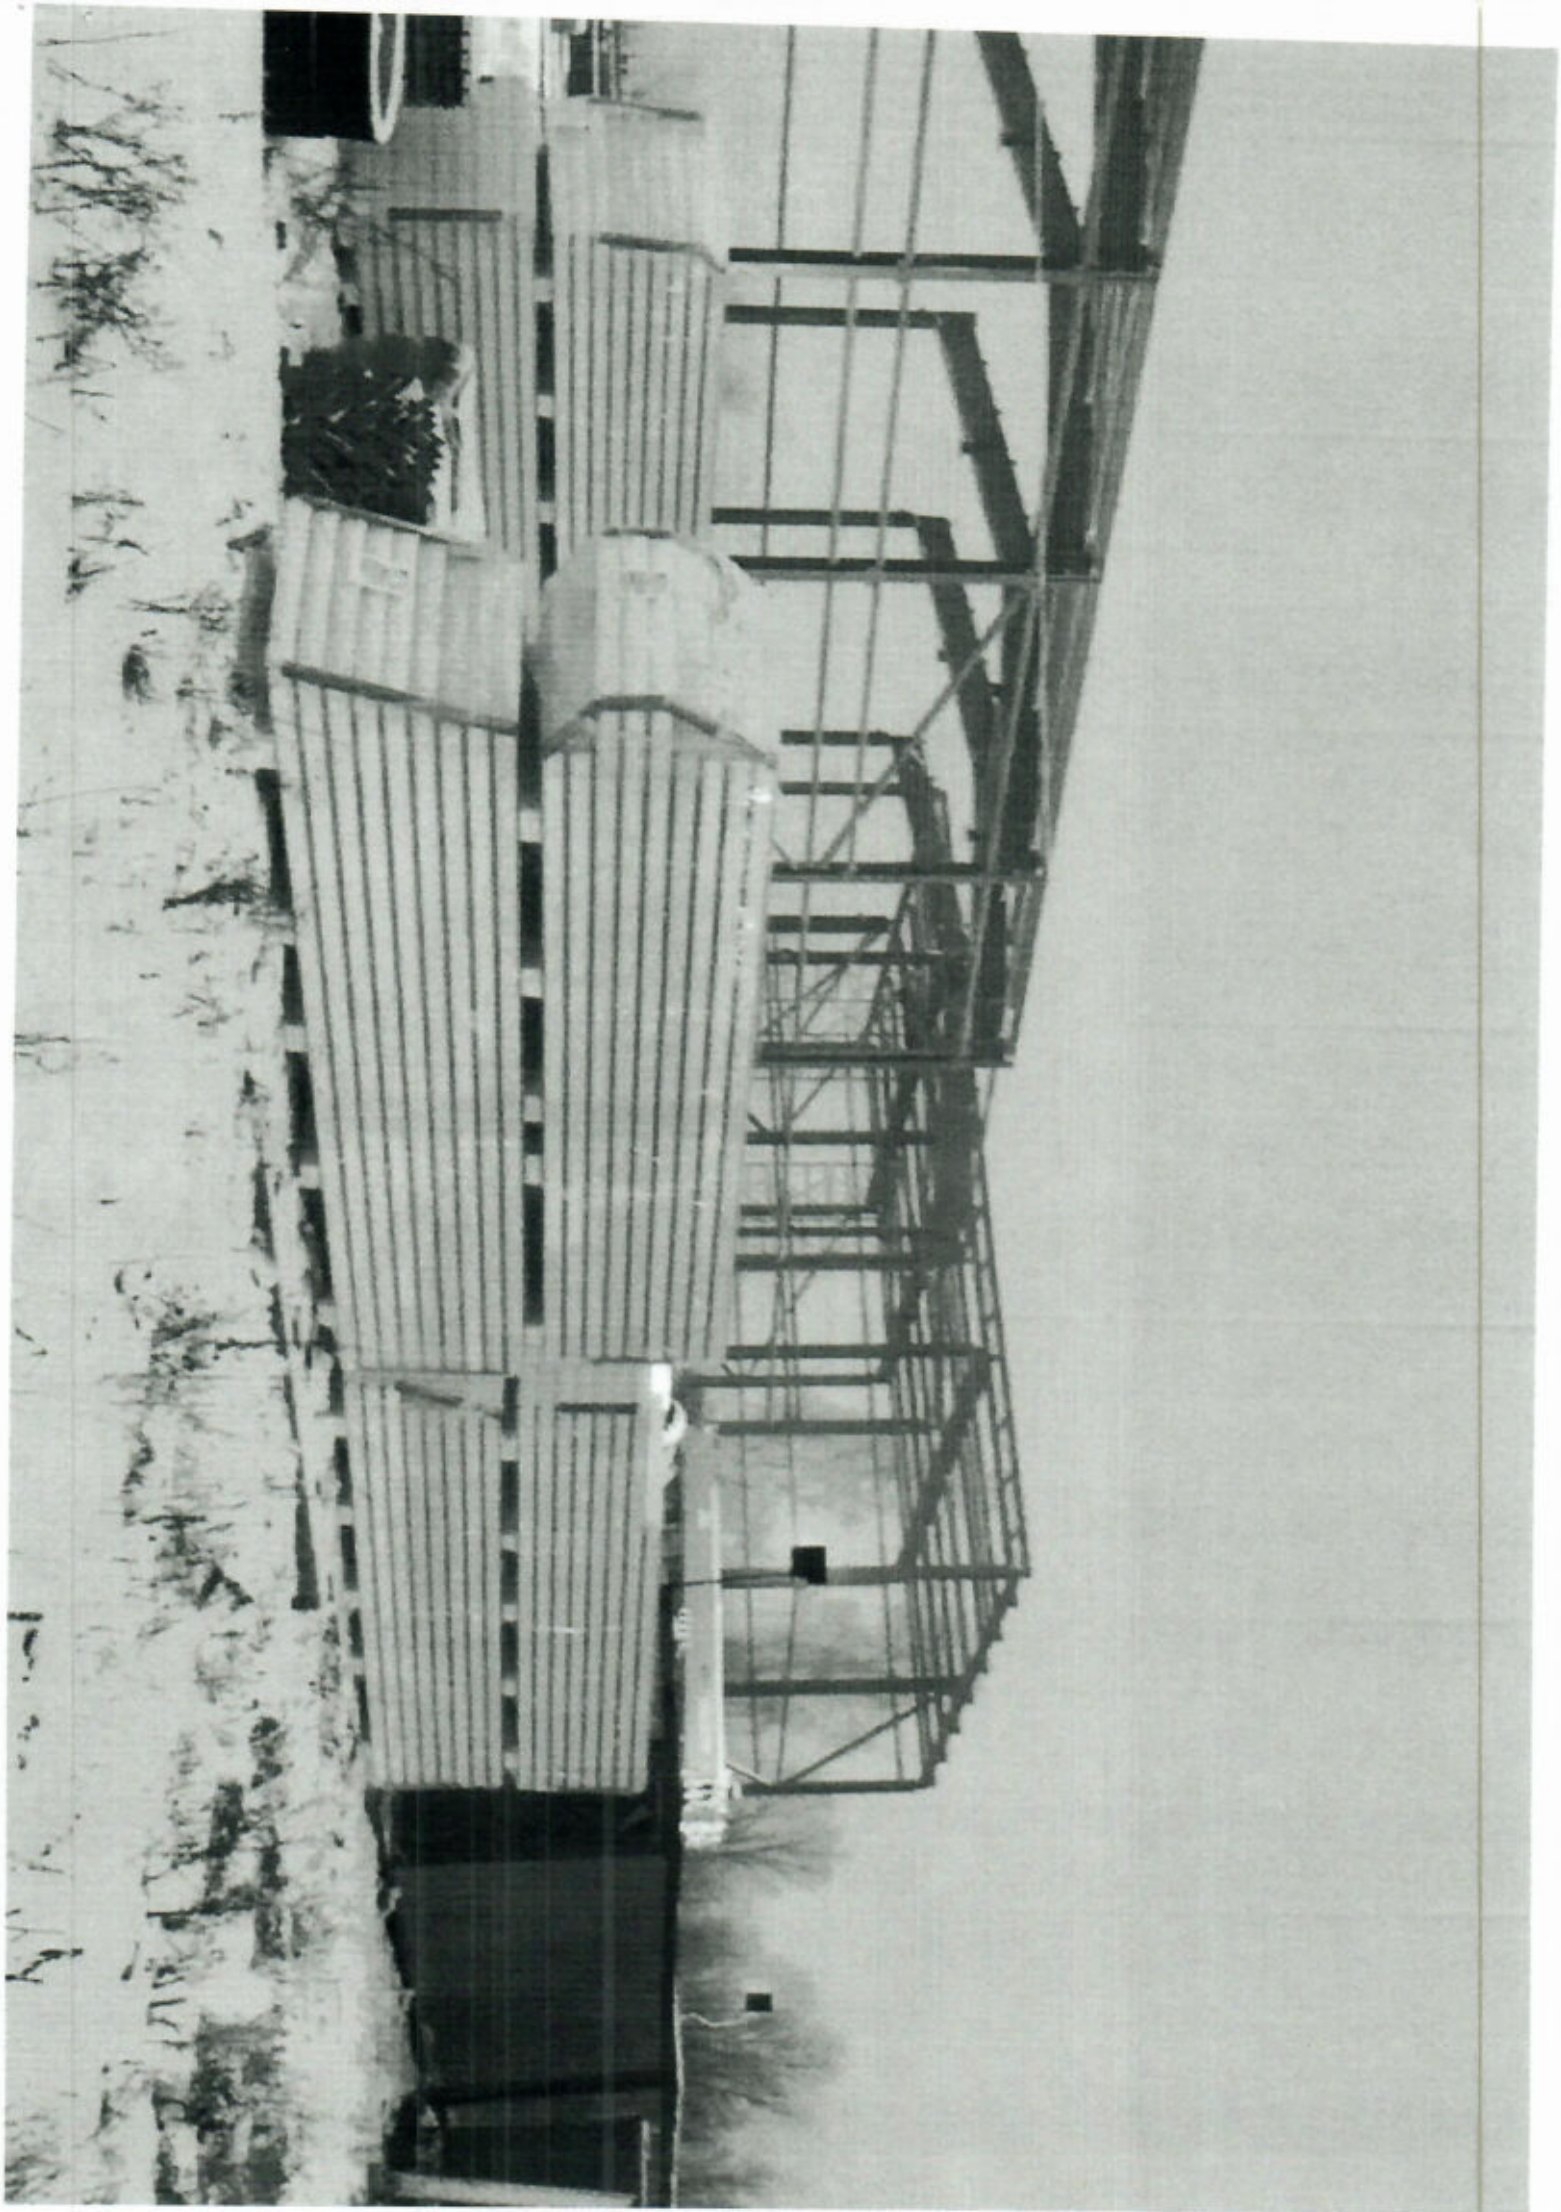



Акт обследования

город Ясногорск

«21» декабря 2020 года

Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;




Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район

Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

В ходе обследования установлено, что по состоянию на 21.12.2020 АО «РГК-1» приступили к укладке кирпичного цоколя, продолжаются работы по монтажу металлоконструкций здания котельной, готовится площадка под кран для установки котлов.


К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:


 М. О. Булдина
 Ю. А. Телков
 Н. А. Трубина







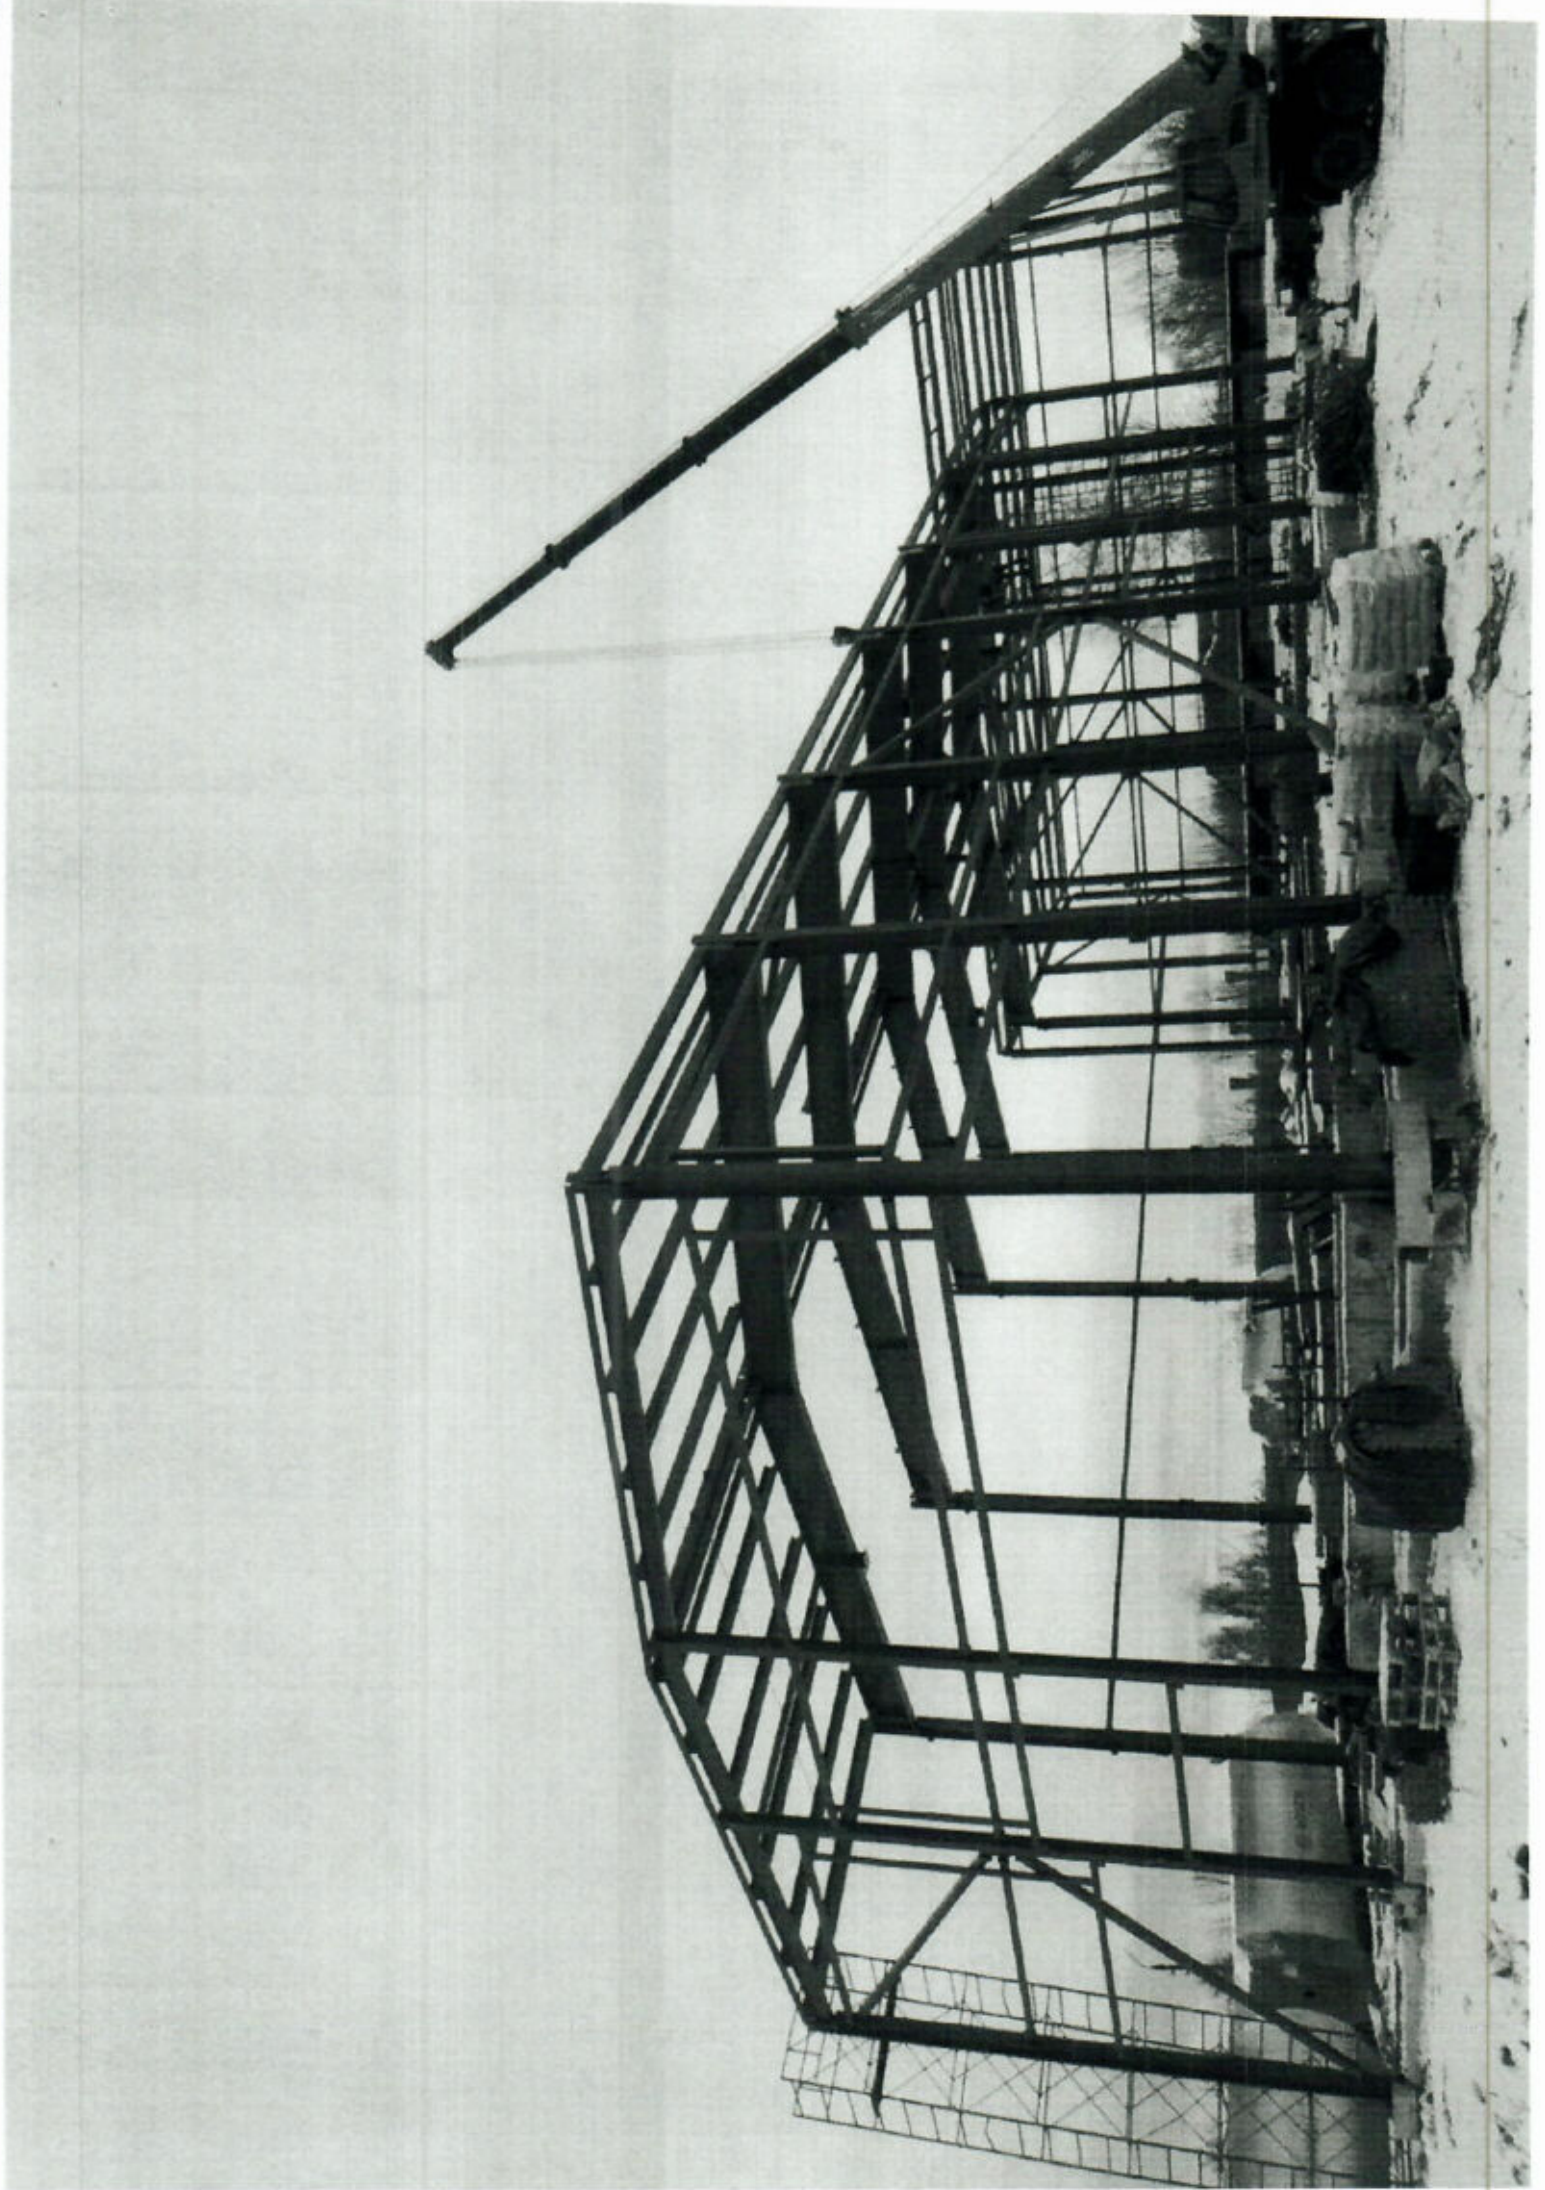




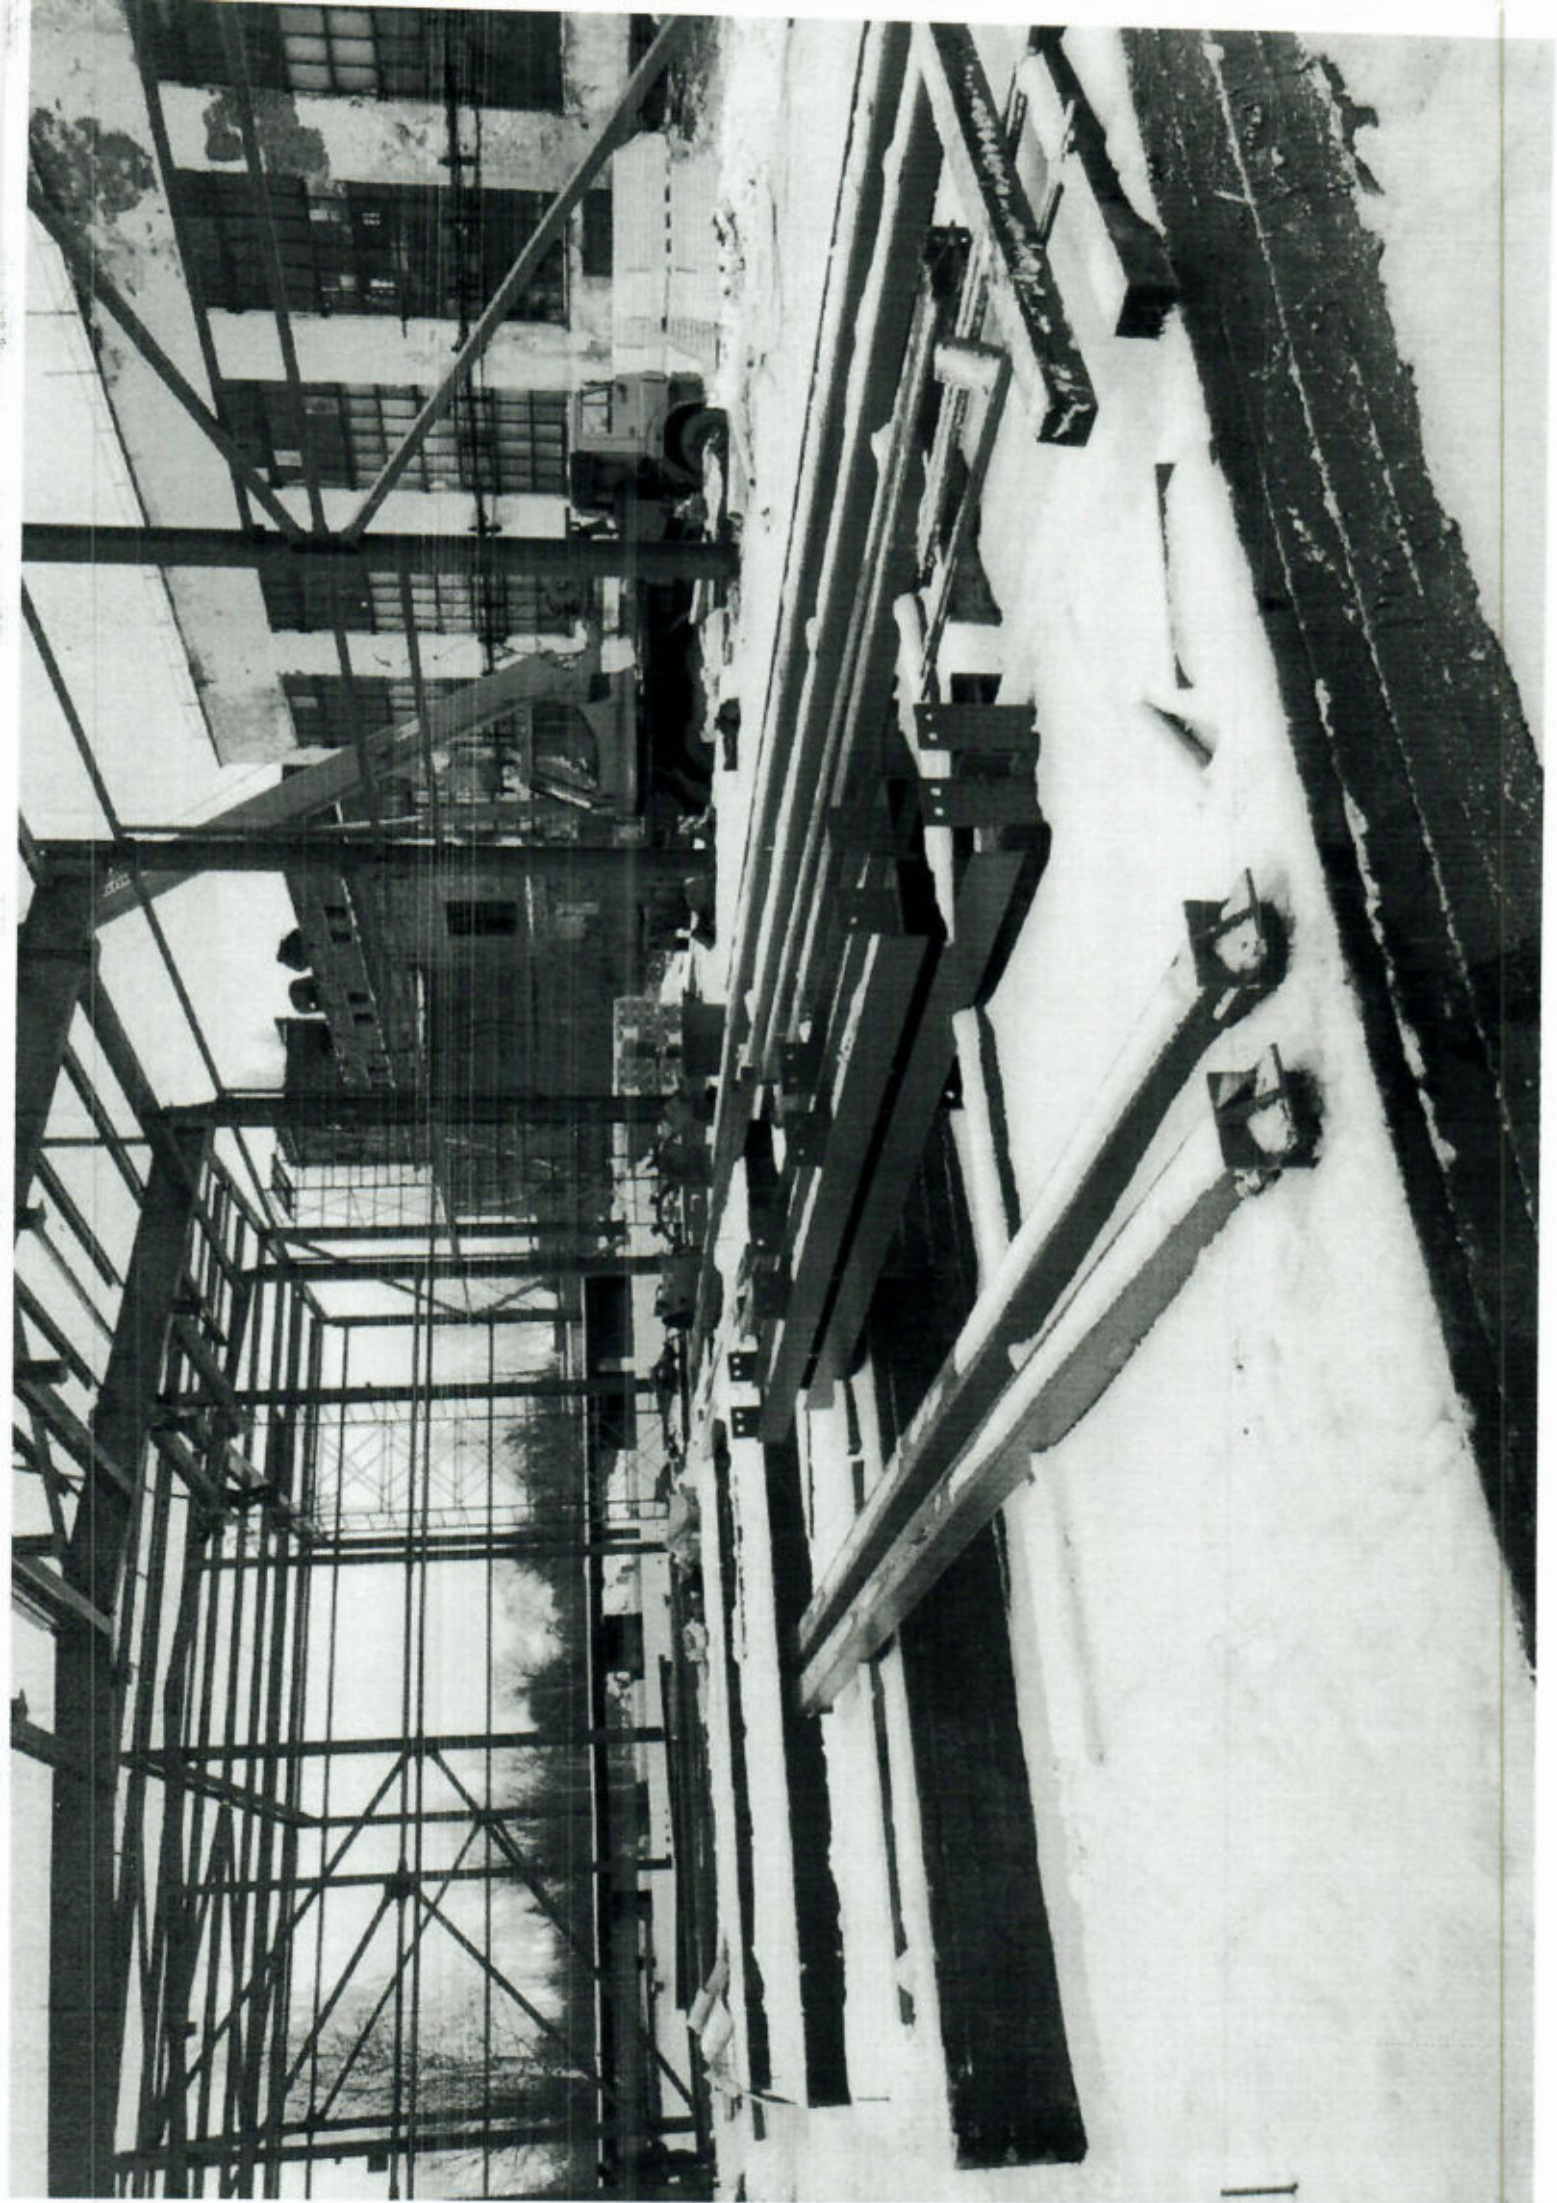

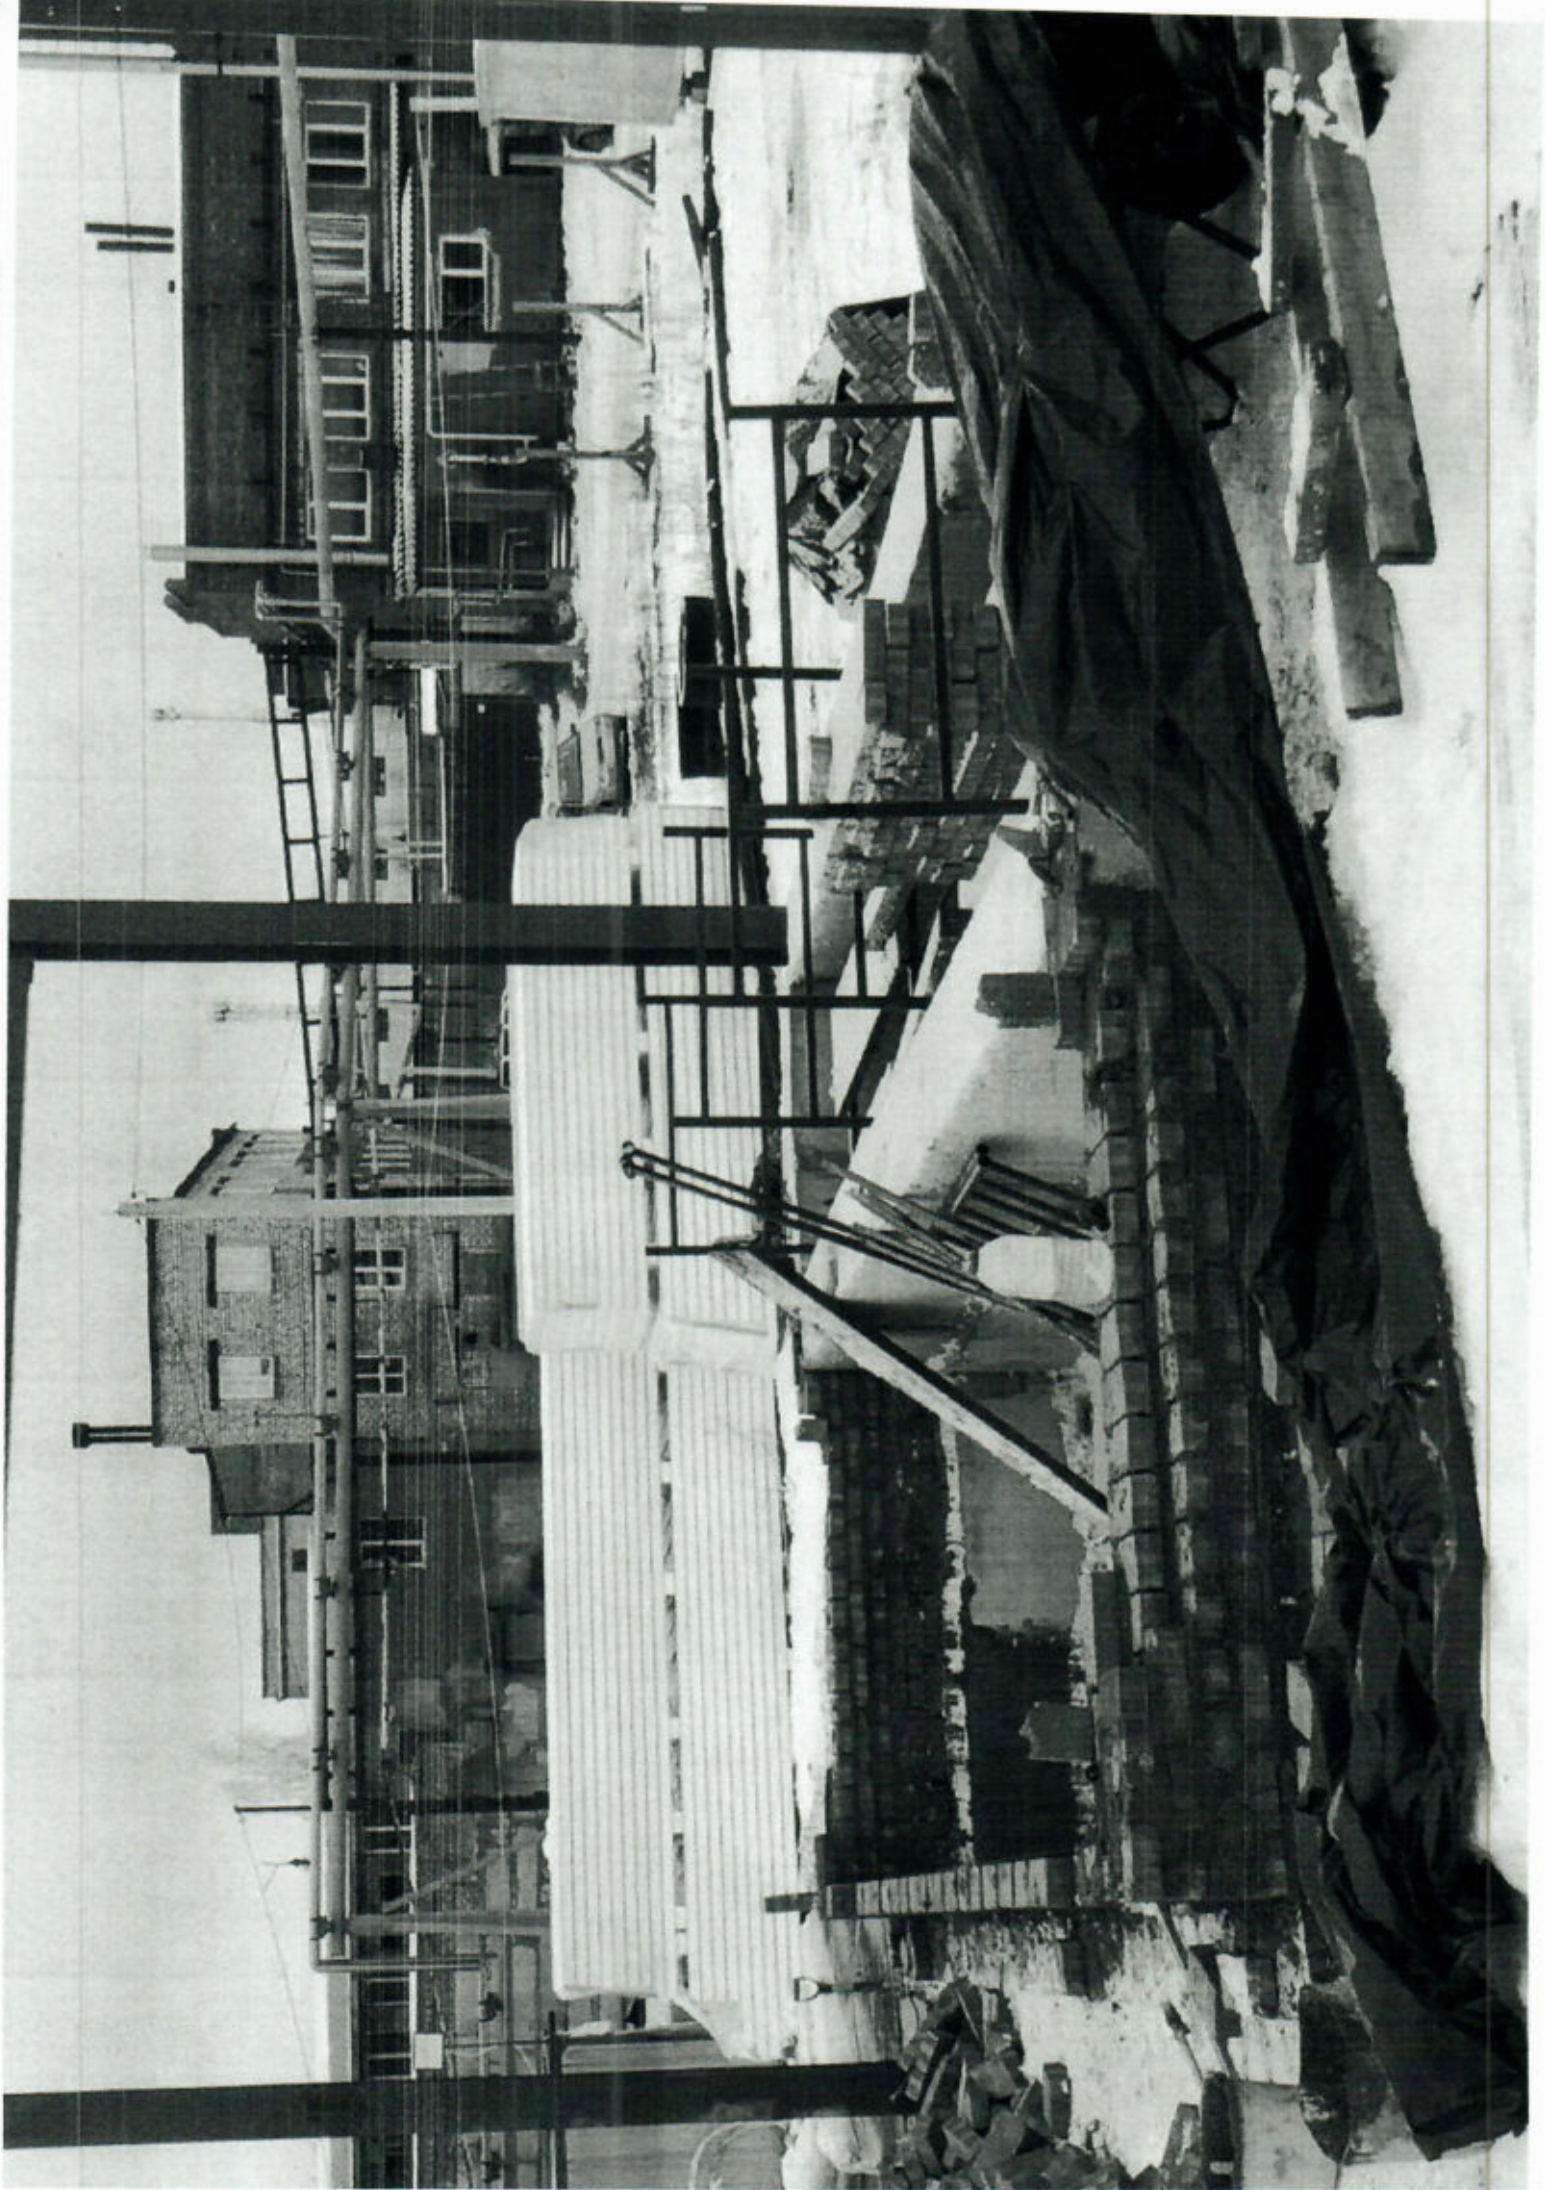

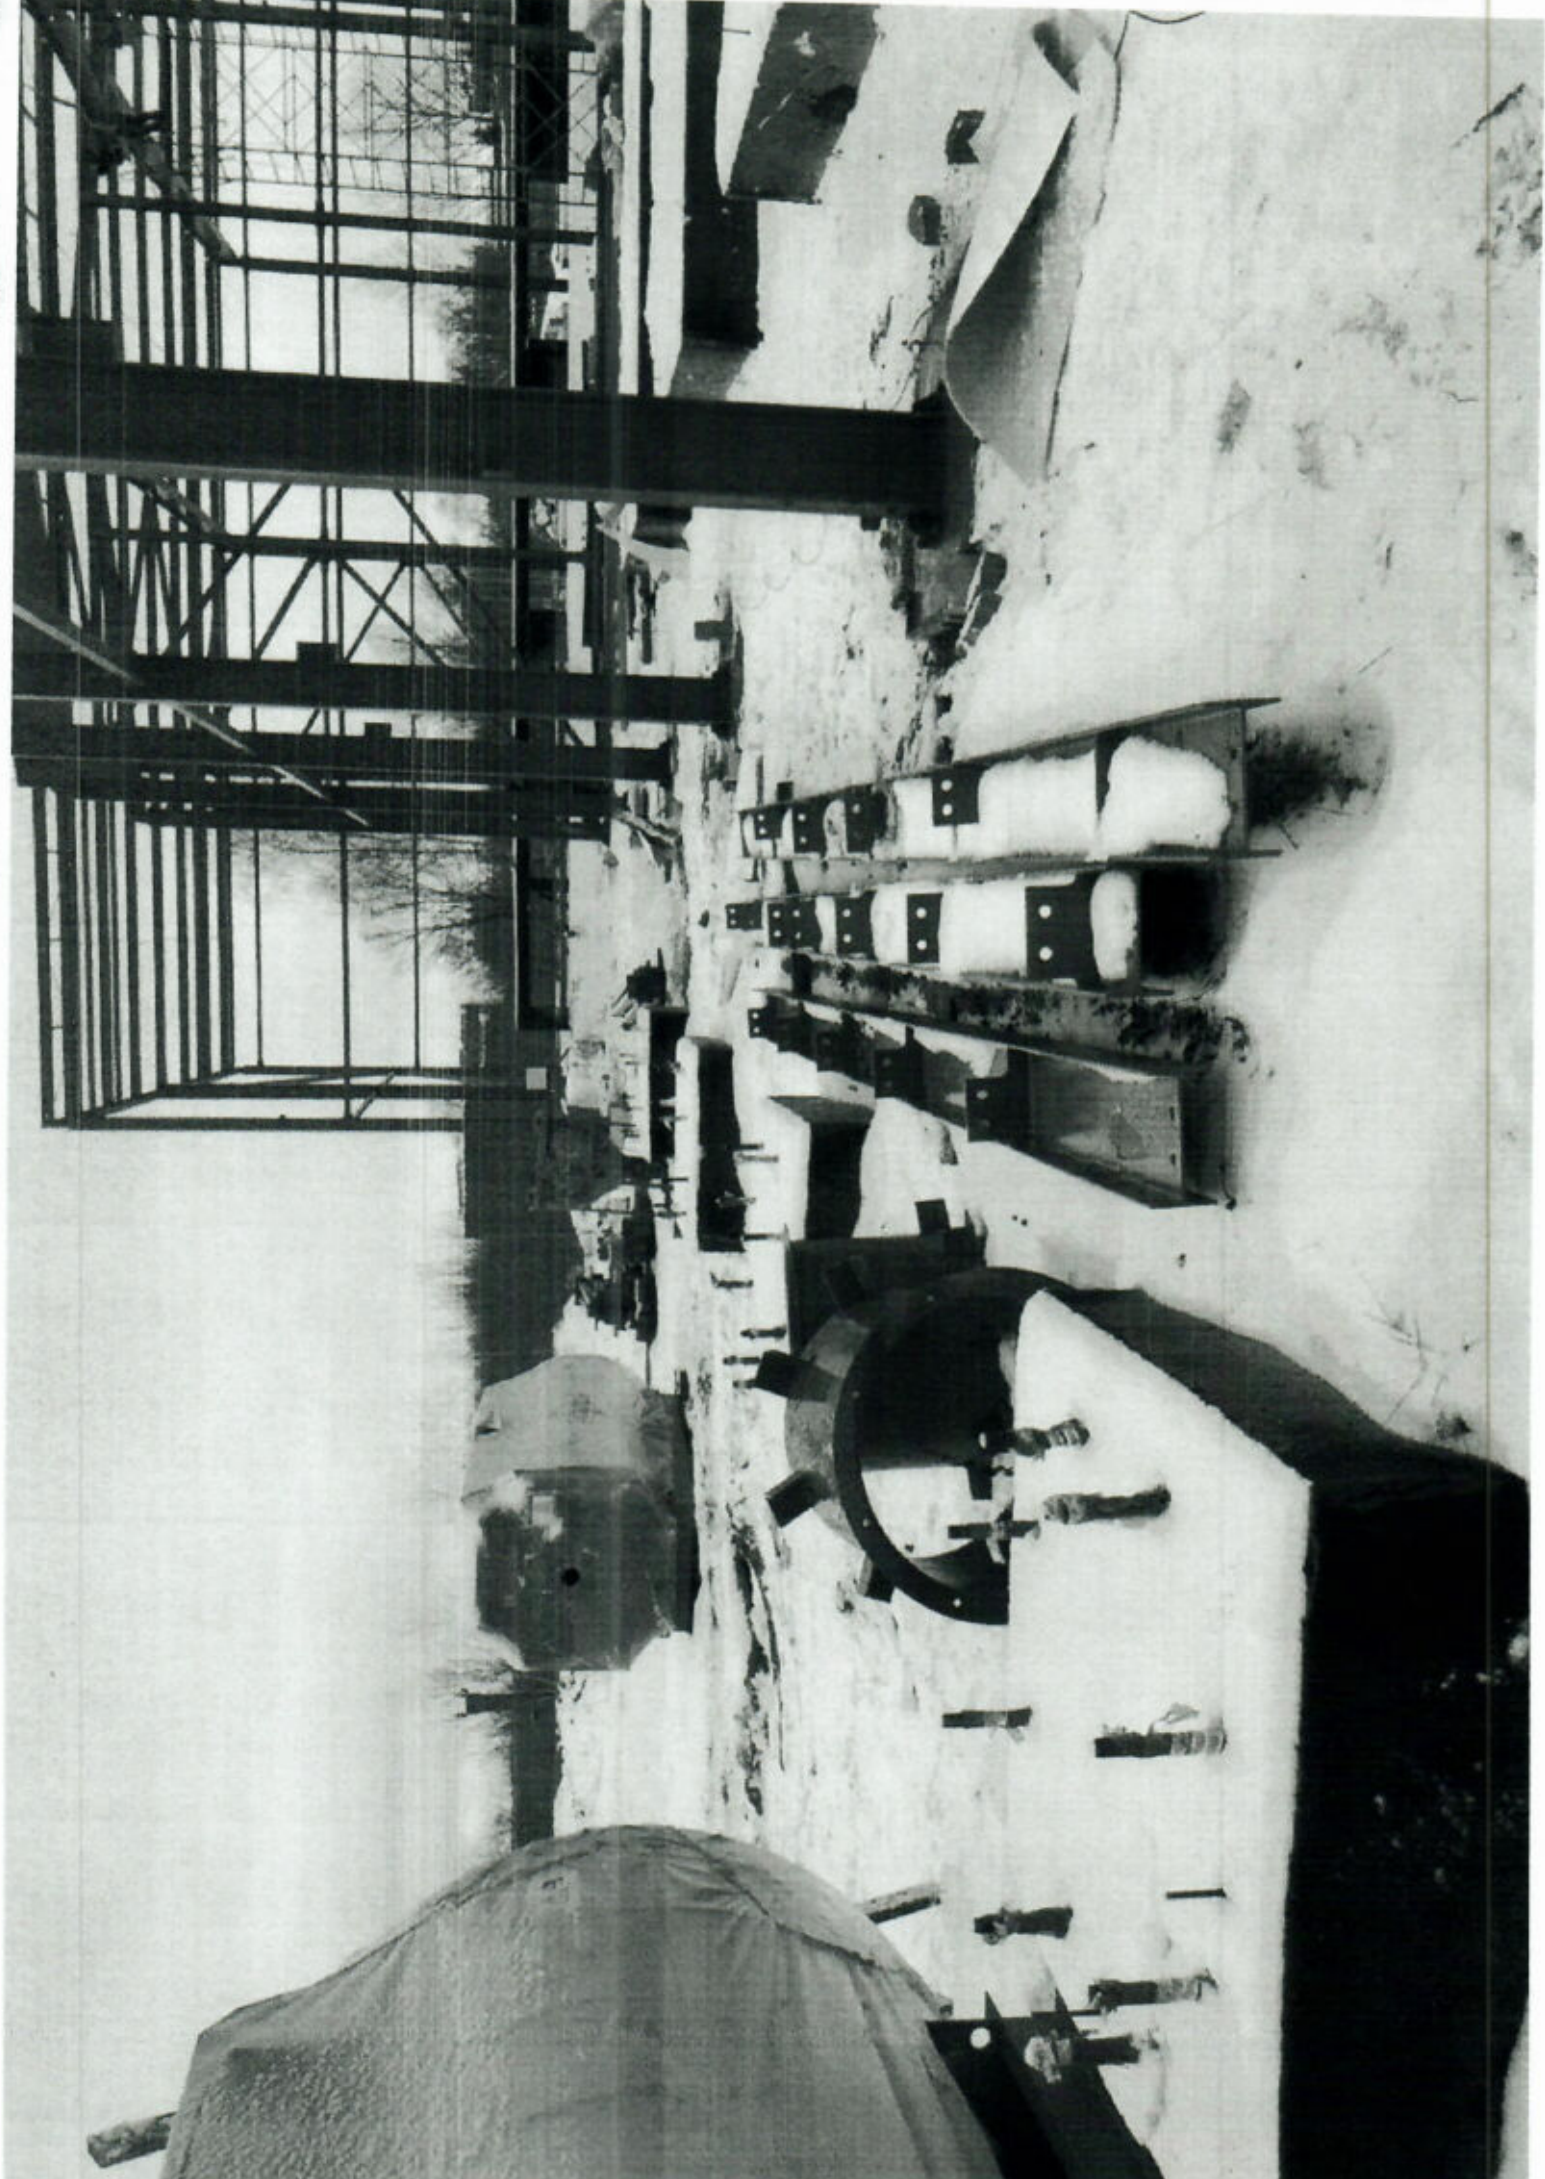

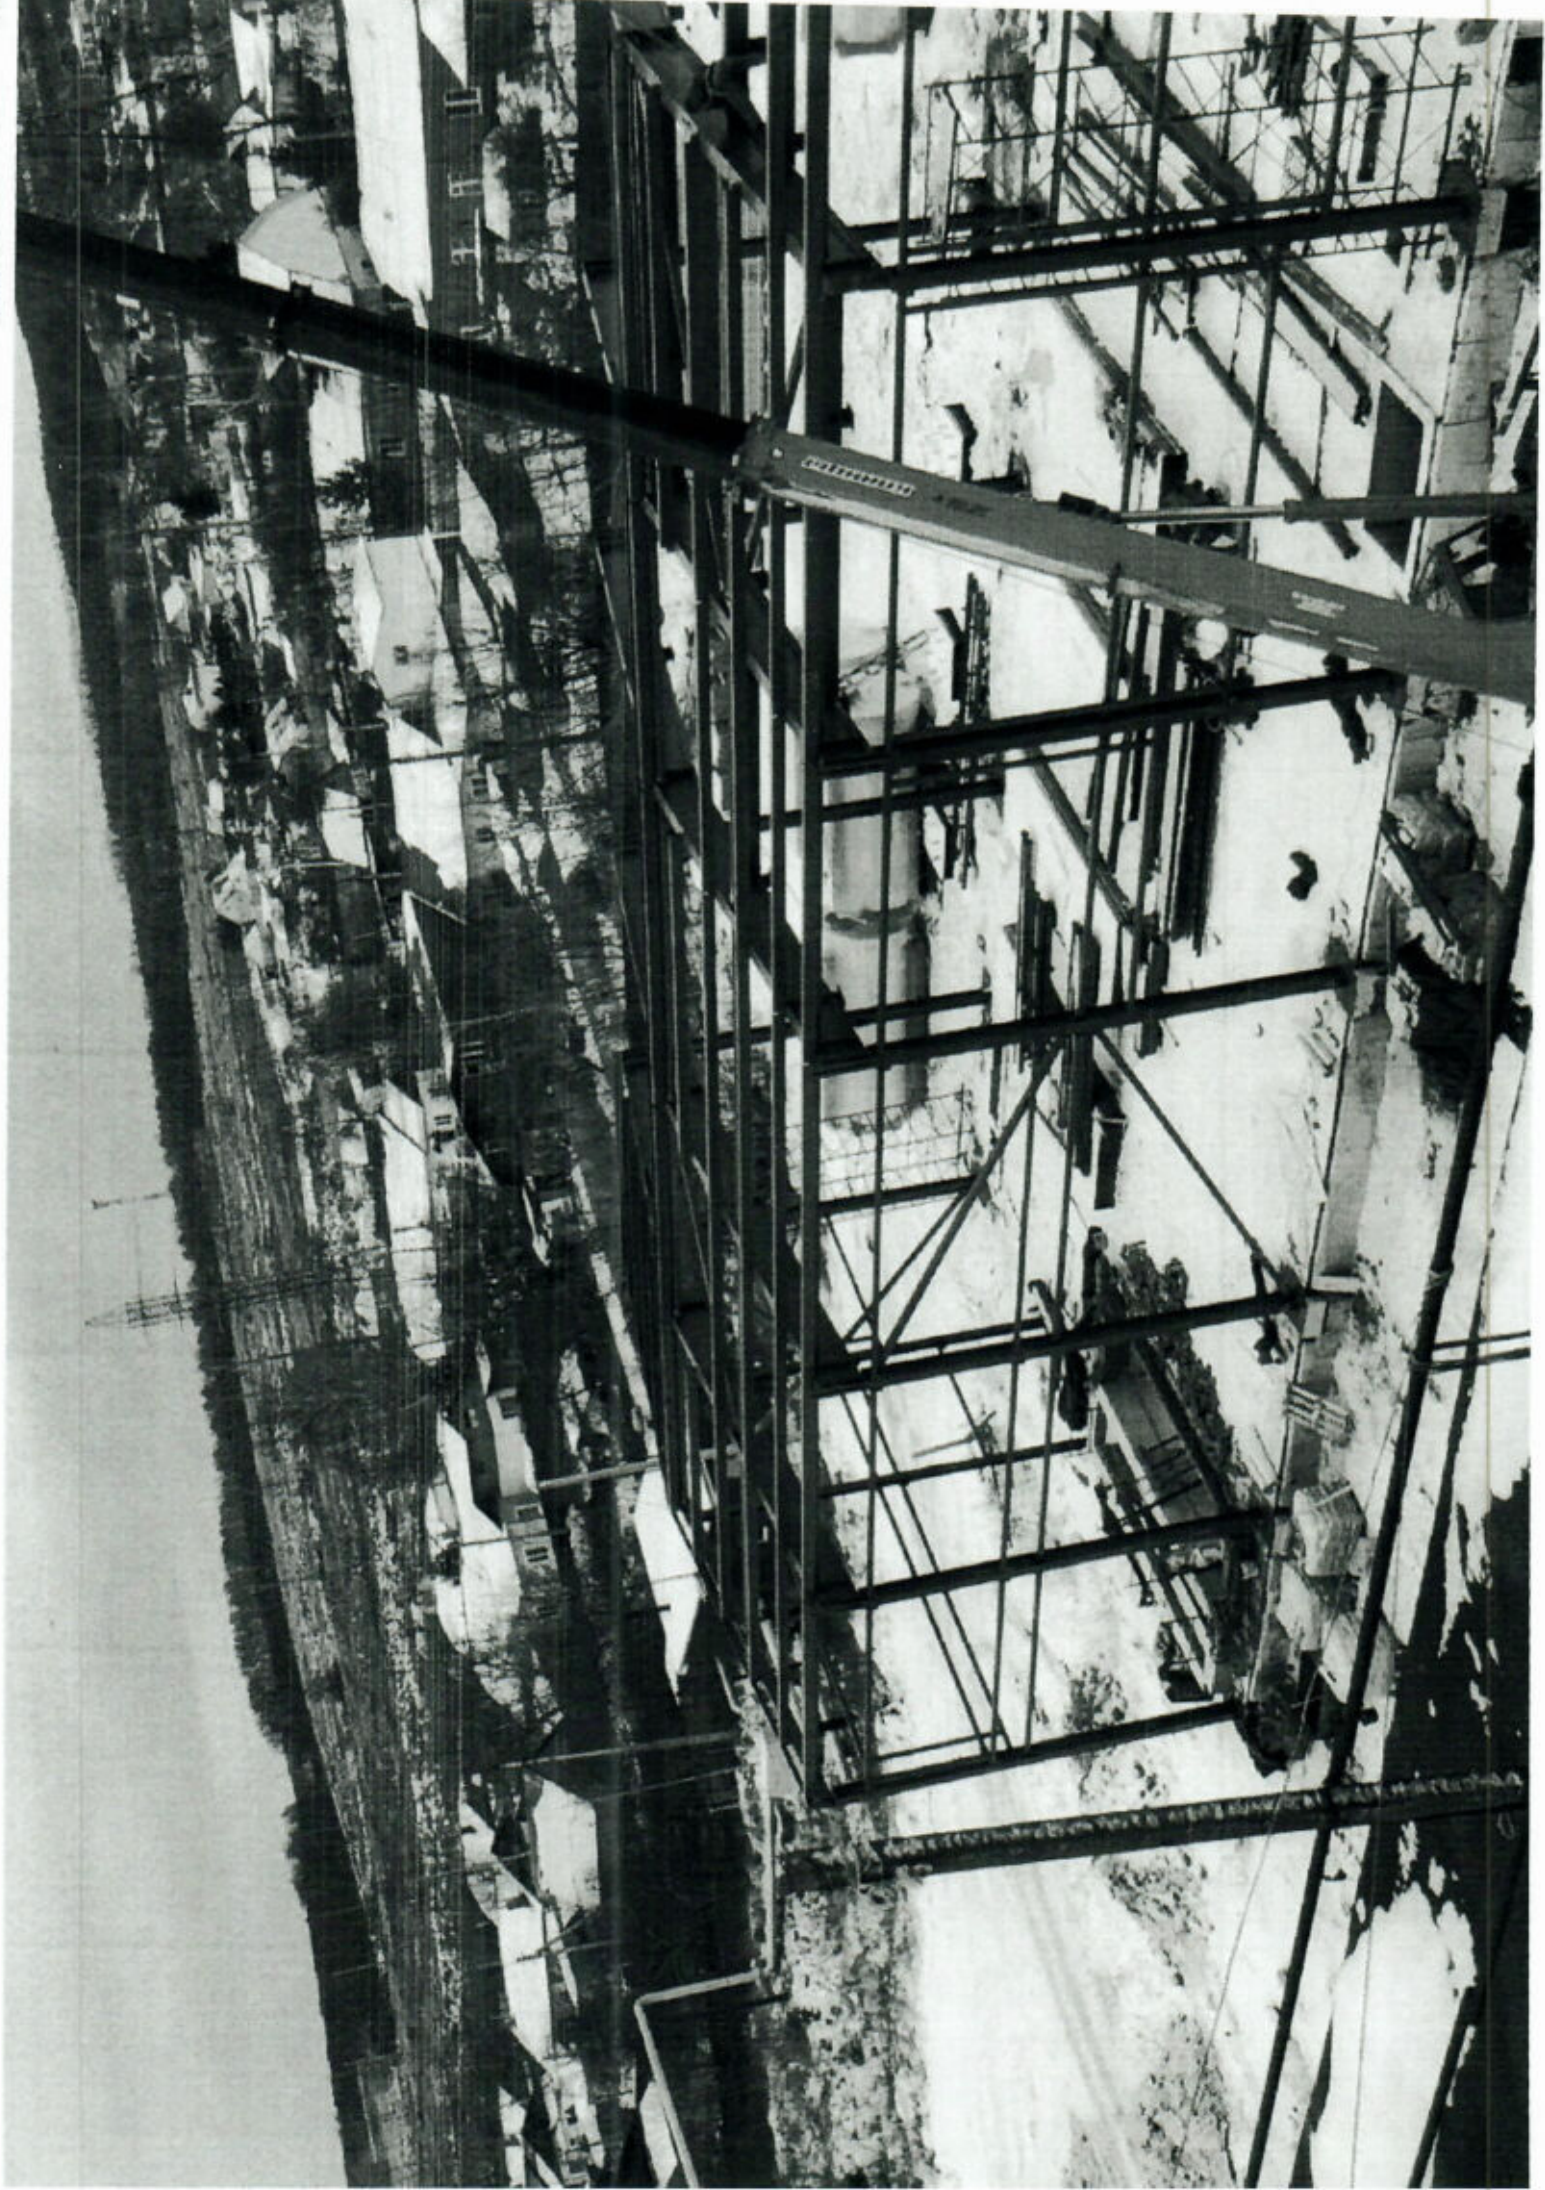





**ИНСПЕКЦИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ НАДЗОРУ**

г. Тула
(место составления акта)

" 10 " апреля 20 20 г.
(дата составления акта)
14 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ АГ-12

По адресу/адресам: Тульская область, Ясногорский район, г. Ясногорск, ул. Заводская, уч. 3-б
(место проведения проверки)

На основании: приказа №178 от 04.03.2020 Мусиенко П.В. начальника инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору о проведении выездной проверки

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена выездная (плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Акционерного общества «Региональная Генерирующая компания №1» (АО «РГК №1») ИНН 7729755620, ОГРН 5137746014225, место нахождения: 301600, Тульская область, г. Узловая, пл. Советская, д.5, пом. 6, этаж 2, наименование и место нахождения объекта: строительство объекта капитального строительства «Газовая котельная» по адресу: Тульская область, Ясногорский район, г. Ясногорск, ул. Заводская, уч. 3-б.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" - " - 20 - г. с - час. - мин. до - час. - мин. Продолжительность -

" - " - 20 - г. с - час. - мин. до - час. - мин. Продолжительность -

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней/ 37,5 часов. Срок проведения с 23.03.2020 по 10.04.2020.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: инспекцией Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) с приказом ознакомлен лично 23.03.2020 в 14-00ч. уполномоченный представитель АО «РГК №1» Груздев О.В. по доверенности от 28.08.2019 №28

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Консультант отдела по надзору за строительством Горелышев Александр Викторович

Консультант отдела по надзору за строительством Панферов Евгений Витальевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: уполномоченный представитель АО «РГК №1» Груздев О.В. по доверенности от 28.08.2019 №28

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
--

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
--

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
--

нарушений не выявлено:

При проведении выездной проверки по п.1 программы проверок от 14.01.2020 г. инспекции Тульской области по государственному архитектурно - строительному надзору при строительстве объекта капитального строительства: «Газовая котельная» по адресу: Тульская область, Ясногорский район, г. Ясногорск, ул. Заводская, уч. 3, нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: -

Подписи лиц, проводивших проверку:

Горелышев А.В. - консультант отдела по надзору за строительством

Панферов Е.В. - консультант отдела по надзору за строительством

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

уполномоченный представитель АО «РГК №1» Груздев О.В. по доверенности от 28.08.2019 №28

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 10 ” апреля 20 20 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Акт обследования

город Ясногорск

«22» декабря 2020 года

Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;


Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район


Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*


В ходе обследования установлено, что по состоянию на 22.12.2020: установлены на фундамент котлы BOSCH (4 шт.)

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:


_____ М. О. Булдина


_____ Ю. А. Телков


_____ Н. А. Трубина
